

NOTA DE EMPENHO 30060007

Ceará
Governo Municipal de São Bedito
FUNDEB
Exercício de 2026

Data: 30/06/2026

Modalidade: global

I N T E R E S S A D O

Credor.... MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
Endereço.. Rua Maria de Lourdes, nº 68, Centro-Santa Quitéria-CE 62280-000
C.N.P.J... 21.691.178/0001-04 Fone (88) 99632-1712

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 07 02 Fundo Munic. Manut e Desenvolvy Educ Bási
Func.programática 12 361 0541 1.018 Const., Amp. e Recuperação Unidades
Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%
Categoria econômica.... 4.4.90.51.00 Obras e instalações
Subelemento..... 4.4.90.51.91 Obras em andamento
Subelemento SIM-CE..... 91 OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de recurso..... 1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... licitação Modalidade. Concorrência
Número do processo..... 90015.2025-CE Exercício.. 2025
Código contrato..... 2026011401
Código transf. ou conv.

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

saldo anterior	Valor empenhado	saldo disponível
445.165,28	373.931,94	71.233,34

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com a 2ª (SEGUNDA) medição dos serviços técnicos especializados em engenharia civil para a Construção de uma Escola de Ensino Básico no Sítio Jacarandá, Município de São Bedito/CE. Conforme Licitação na modalidade Concorrência de nº 90015.2025-CE, Contrato de nº 2026011401.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	SERVIÇ 089457 Construção de uma Escola de Ensino Básico no Sítio Jacarandá	73.931,94	373.931,94

São Bedito, 30 de Junho de 2026.
Autorizo

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
EMPENHADOR


LUCIA DE FATIMA GONCALVES DE PAULA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

NOTA DE SUBEMPENHO 09070003

Ceará
Governo Municipal de São Benedito
FUNDEB
Exercício de 2026

DATA: 09/07/2026

Doc.Caixa: 09070003

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30060007 VALOR..... R\$ 373.931,94
DATA DO EMPENHO... 30/06/2026 MODALIDADE.. global

Credor.... MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
Endereço.. Rua Maria de Lourdes, nº 68, Centro-Santa Quitéria-CE 62280-000
C.N.P.J... 21.691.178/0001-04 Fone (88) 99632-1712

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07 02. Fundo Munic. Manut e Desenvolvy Educ Bási
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 361 0541 1.018 Const., Amp. e Recuperação Unidades
Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 31
CATEGORIA ECONÔMICA.... 4.4.90.51.00 Obras e instalações
SUBELEMENTO..... 4.4.90.51.91 Obras em andamento
Subelemento SIM-CE..... 91 OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE DE RECURSO..... 1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR VALOR SUBEMPENHADO SALDO DISPONÍVEL
373.931,94 373.931,94 0,00

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)

Pagamento da NEG 30060007 emitida em 30/06/2026
REFERENTE - NF: 3416 373.931,94

São Benedito, 09 de Julho de 2026.
Autorizo

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
EMPENHADOR

LUCIA DE FATIMA GONCALVES DE PAULA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 01070070

Ceará
 Governo Municipal de São Bedito
 FUNDEB
 Exercício de 2026

DATA: 01/07/2026

E M P E N H O O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 30060007
 DATA DO EMPENHO... 30/06/2026

VALOR..... R\$ 373.931,94
 MODALIDADE.. global

Credor.... MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
 Endereço.. Rua Maria de Lourdes, nº 68, Centro-Santa Quitéria-CE 62280-000
 C.N.P.J... 21.691.178/0001-04 Fone (88) 99632-1712

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07 02. FUNC.PROGRAMÁTICA 12 361 0541 1.018 CATEGORIA ECONÔMICA.... 4.4.90.51.00 SUBELEMENTO..... 4.4.90.51.91 Subelemento SIM-CE..... 91 FONTE DE RECURSO..... 1542000000	Fundo Munic. Manut e Desenvolvy Educ Bási Const., Amp. e Recuperação Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30% Obras e instalações Obras em andamento OBRAS EM ANDAMENTO Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT
--	--

D I S C R I M I N A Ç Ã O D E I T E N S

Item	quantidade	unidade	Código	especificação	valor unitário	valor total
001	1,0000	SERVIÇ	089457	Construção de uma Escola de Ensino Básico no Sítio Jacarandá, Município de São B	373.931,94	373.931,94

D A D O S D A L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 373.931,94
 Nota fiscal serviço 3416 Série E
 DATA DA EMISSÃO: 01/07/2026
 Chave de acesso
 (estad./munic.): 3416

São Bedito, 01 de Julho de 2026.



LUCIA DE FATIMA GONCALVES DE PAULA
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
 Governo Municipal de São Bedito
 FUNDEB

CLASSIFICAÇÃO		ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO.....	07	Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	07 02.	Fundo Munic. Manut e Desenvolví Educ Bási
CLASSIFICAÇÃO 12 361 0541 1.018		Const., Amp. e Recuperação Unidades
		Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%
CATEGORIA ECONÔMICA 4.4.90.51.00		Obras e instalações
SUBELEMENTO 4.4.90.51.91		Obras em andamento
Subelemento SIM-CE.....	91	OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE DE RECURSO.....	1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT

DADOS DO		EMPENHO
NOTA DE EMPENHO Nº 30060007	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 373.931,94	TIPO DE LICITAÇÃO.. licitação - Concorrência
DATA DO EMPENHO... 30/06/2026	MODALIDADE..... global	Nº DA LICITAÇÃO... 90015.2025-CE
SALDO ANTERIOR... R\$ 373.931,94	VALOR PAGO..... R\$ 373.931,94	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

PAGUE-SE a importância
 constante na presente nota



LUCIA DE FATIMA GONÇALVES DE PAULA
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 09070003, de 09/07/2026

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....20.857-4 (PMSB/FUNDEB GERAL)	070901	344.391,32
Desconto de ISSQN (talão de receita 09070031)		7.478,64
Desconto de IRRFPJ (talão de receita 09070032)		5.608,98
Desconto de INSS (talão de receita 09070033)		16.453,00

Identificação do credor:

Credor.... MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
 Endereço.. Rua Maria de Lourdes, nº 68, Centro-Santa Quitéria-CE 62280-000
 C.N.P.J... 21.691.178/0001-04 Fone (88) 99632-1712

CNPJ 07.778.129/0001-74	Razão Social MUNICIPIO DE SAO BENEDITO	Pagar este documento até 20/07/2026
Período de Apuração 30/06/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.01.26182.0919772-8
Observações REF A NF 3416 E CNO nº 90.028.14407/72 Darf emitido pelo Sicalc Web		Valor Total do Documento 16.453,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	16.453,00			16.453,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 06/2026 Vencimento 20/07/2026				
	CNO 90.028.14407/72 CNPJ Prestador 21.691.178/0001-04				
	Totais	16.453,00			16.453,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000164 0 53000385262 1 01070126182 7 09197728676 6



CNPJ: 07.778.129/0001-74
Número: 07.01.26182.0919772-8
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 16.453,00

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3331611006224711
16/07/2026 11:08:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.44
2606902606 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SECRETARIA E M S BENEDITO

AGENCIA: 2606-9 CONTA: 20.857-4

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85820000164-0 53000385262-1

01070126182-7 09197728676-6

Data do pagamento 09/07/2026

Numero do Documento 07.01.26182.0919772-8

Valor Total 16.453,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 070902

AUTENTICACAO SISBB: 7.36E.AD5.78C.228.CB0

Transação efetuada com sucesso por: JH933603 GISELENE MARINHO COELHO MARTINS.



Estado do Ceará
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Rua Paulo Marques, 378, Centro
07.954.514/0001-25

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202601915

À
MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
Rua Maria de Lourdes, nº 68
Centro - Santa Quitéria/CE

Assunto: Contratação dos serviços técnicos especializados em engenharia civil para a Construção de uma Escola de Ensino Básico no Sítio Jacarandá, Município de São Benedito/CE

Processo de compra: Licitação na modalidade Concorrência nº 90015.2025-CE - Contrato nº 2026011401

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 10/10/2025, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s)/serviço(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

Item Descrição	Marca	Quant./Unidade	Vlr.unitário(R\$)	Vlr.total(R\$)
1 Construção de uma Escola de Ensino Básico no SERVIÇO o Sítio Jacarandá, Município de São B Especificação: Construção de uma Escola de Ensino Básico no Sítio Jacarandá, Município de São Benedito/CE		1,0000	373.931,940	373.931,94
TOTAL.:				373.931,94

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS A SEREM ENTREGUES/EXECUTADOS

O(s) produto(s)/serviço(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s)/realizado(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra(Licitação na modalidade Concorrência nº 90015.2025-CE), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade indicando a especificação completa do(s) produto(s)/serviço(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, situada na Rua Paulo Marques, 378, Centro, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 07.954.514/0001-25.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s)/serviço(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.



''
''

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s)/serviço(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 14.133/2021 - Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

São Benedito-CE, 30 de Junho de 2026

LUCIA DE FATIMA GONCALVES DE PAULA
ORDENADOR DE DESPESAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
C.N.P.J. (MF). 07.954.514/0001-25

Ciente e de acordo em ____/____/____.

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J(MF) 21.691.178/0001-04

Chave de Acesso da NFS-e
2312205122169117800010400000000341626077036215600

Número da NFS-e
3416

Competência da NFS-e
01/07/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/07/2026 17:05:54

Número da DPS
3416

Série da DPS
1

Data e Hora da emissão da DPS
01/07/2026 00:00:00



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 21.691.178/0001-04	Inscrição Municipal 7494	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME		E-mail ERISONMESQUITA@HOTMAIL.COM	
Endereço RUA CEL JOAO RODRIGUES PINTO, 355 A, SALA 03 1 ANDAR, CENTRO		Município SANTA QUITÉRIA - CE	CEP 00000-000
Simplex Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.778.129/0001-74	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE SAO BENEDITO		E-mail -	
Endereço RUA PAULO MARQUES, 378, CENTRO		Município São Benedito - CE	CEP 62370-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.02.02 - 702 / Execução, por administração, empreitada ou subempre...	Código de Tributação Municipal - 702 / 412040000 - Execução, por administração, empreitada...	Local da Prestação SÃO BENEDITO - CE	País da Prestação -
Descrição do Serviço CONTRATO N: 2026.01.14.01 ART N: CE20261801599 CNO N: 90.028.14407/72 CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO BÁSICO NO SÍTIO JACARANDÁ 2a MEDIÇÃO: R 373.931,94 MATERIAL (60): R 224.359,16 M.D.O (40): R 149.572,78 DADOS BANCÁRIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4484 C/C 577856011-3			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN SÃO BENEDITO - CE	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 373.931,94	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 373.931,94	Alíquota Aplicada 2,00%	Retenção do ISSQN Retido pelo Tomador	ISSQN Apurado R\$ 7.478,64

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R\$ 5.608,98	Contribuição Previdenciária - Retida R\$ 16.453,00	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria R\$ 2.430,56	COFINS - Débito Apuração Própria R\$ 11.217,96		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 373.931,94	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido R\$ 7.478,64
Total das Retenções Federais R\$ 22.061,98	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 344.391,32

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais R\$ 35.710,50	Estaduais R\$ 0,00	Municipais R\$ 0,00
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 90.028.14407/72 | NBS: 101012900

DAVID DE SOUSA
FERNANDES:9681
2052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA
FERNANDES:96812052353
- NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, CN=2803806000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado
- AF AL: CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353
- Razão: Eu sou o autor deste documento
- Localidade:
- Data: 2026.07.04 18:29:09-03'00'
- Fonte PDF: Editor Versão: 2025.2.1



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2606-9
Conta corrente 20857-4 SECRETARIA E M S BENEDITO

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4484 SANTA QUITERIA
Conta corrente (com DV) 5778560113
CNPJ 21.691.178/0001-04
Nome favorecido MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.901
Valor 344.391,32
Destinação 26
Data transferência 09/07/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 08161787DE621DF8

Assinada por JH933603 GISLENE MARINHO COELHO MARTINS
JC563256 LUCIA DE FATIMA GONCALVES DE PAULA

09/07/2026 15:33:41

09/07/2026 15:38:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC563256 LUCIA DE FATIMA GONCALVES DE PAULA.

ata da consulta: 08/07/2026 17:20:51

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 21.691.178/0001-04

- opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Verificar

Gerar PDF



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 0000000240

Razão Social

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000007494

C.N.P.J.: 21691178000104

Bairro

CENTRO

CEP

Localizado RUA CEL JOAO RODRIGUES PINTO, 355 A - SALA 03 1º ANDAR - -

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

15865 - MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME

Endereço

RUA CEL JOAO RODRIGUES PINTO, 355 A SALA 03 1º ANDAR

Documento

C.N.P.J.: 21.691.178/0001-04

CENTRO Santa Quitéria-CE CEP: 62280000

No. Requerimento

0000000240/2026

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE FINANÇAS se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.santaquiteria.ce.gov.br/>

SANTA QUITERIA-CE, 25 DE MAIO DE 2026

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 22/08/2026

COD. VALIDAÇÃO:01202142A00000015865





**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202607701737

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 064370879
CNPJ / CPF: 21691178000104
RAZÃO SOCIAL: MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/06/2026 ÀS 00:12:08

VÁLIDA ATÉ 02/08/2026

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.691.178/0001-04
Razão social: MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA CEL JOAO RODRIGUES PINTO 355 A SALA 03/ CENTRO / SANTA QUITERIA / CE / 62280-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/06/2026 a 19/07/2026

Certificação Número: 2026062003502299887967

Informação obtida em 22/06/2026 23:27:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.691.178/0001-04

Certidão nº: 7313694/2026

Expedição: 03/02/2026, às 10:02:39

Validade: 02/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.691.178/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.691.178/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:58:23 do dia 03/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/08/2026.

Código de controle da certidão: **D58E.E990.8B31.6EA6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.028.14407/72	Nome da obra MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Data do cadastramento 10/04/2026 12:13
Origem do cadastramento e-CAC		
Tipo Zona Zona Urbana	ART CE20261801599	RRT CIB
		Cadastro Imobiliário 0000
Data do início da obra 14/01/2026	CNAE 4120400 Construção de edifícios	

Situação da obra

Situação Ativa	Data 14/01/2026
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município SAO BENEDITO	UF CE	CEP 62.370-000
Bairro ZONA RURAL	Logradouro OUTROS LOCALIDADE SÍTIO JACARANDÁ	Número SN	
Observações			

Responsável

Nome MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ 21.691.178/0001-04	Vínculo Incorporador de Construção Civil
Data de início da responsabilidade 14/01/2026	Data de término da responsabilidade	

Obra por Contrato

Unidade de Medida Outra	Medida 1,00	Número do Contrato	Valor do Contrato
-----------------------------------	-----------------------	---------------------------	--------------------------



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261915557

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

DAVID DE SOUSA FERNANDES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, PÓS-GRAD.LATO SENSU ENGA. AMBIENTAL E SANEAM. BÁSICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MBA EM CUSTOS E ORÇAMENTO DE ENGENHARIA, PÓS-GRADUAÇÃO (LATO SENSU) EM GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS, TECNÓLOGO EM ELETROMECÂNICA**

RNP: 0601332237

Registro: 40581CE

Empresa contratada: **MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA**

Registro : 0010513310-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO**

CPF/CNPJ: 07.778.129/0001-74

RUA PAULO MARQUES

Nº: 378

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO BENEDITO**

UF: **CE**

CEP: 62370000

Contrato: **2026.07.01.02**

Celebrado em: **01/07/2026**

Valor: **R\$ 154.798,92**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

ESTRADA JACARANDA

Nº: 00

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **SÃO BENEDITO**

UF: **CE**

CEP: 62370000

Data de Início: **01/07/2026**

Previsão de término: **01/07/2027**

Coordenadas Geográficas: **-4.062694, -40.906130**

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO**

CPF/CNPJ: 07.778.129/0001-74

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO

60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA

60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

Quantidade

Unidade

5.870,66

m2

5.870,66

m2

5.870,66

m2

5.870,66

m2

5.870,66

m2

5.870,66

m2

5.870,66

m2

5.870,66

m2

5.870,66

m2

19 - Fiscalização em BIM

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS

Quantidade

Unidade

5.870,66

m2

5.870,66

m2

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 36cC4
 Impresso em: 07/07/2026 às 16:44:22 por: , ip: 138.255.230.146

www.crea-ce.org.br
 Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
 Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261915557

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	5.870,66	m2
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO	5.870,66	m2
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	5.870,66	m2
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	5.870,66	m2
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA	5.870,66	m2
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	5.870,66	m2
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	5.870,66	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO BÁSICO NO SÍTIO JACARANDÁ, MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE (CT- 2026.01.14.01)

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
 Local data



Documento assinado eletronicamente
 com credenciais de login e senha

DAVID DE SOUSA FERNANDES

RNP: 0601332237

Data: 07/07/2026 16:44:22

DAVID DE SOUSA FERNANDES - CPF: 968.120.523-53

MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CNPJ: 07.778.129/0001-74

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 285,59** Registrada em: **07/07/2026** Valor pago: **R\$ 285,59** Nosso Número: **8218987038**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 36cC4
 Impresso em: 07/07/2026 às 16:44:22 por: , ip: 138.255.230.146

www.creace.org.br
 Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
 Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261801599

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANTÔNIO ERISON MOREIRA DE MESQUITA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0611605309

Registro: 50350D CE

Empresa contratada: **MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP**

Registro : 0010357521-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO**

RUA PAULO MARQUES

Complemento:

Cidade: **SÃO BENEDITO**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: 07.778.129/0001-74

Nº: 378

CEP: 62370000

Contrato: 2026.01.14.01

Celebrado em: 14/01/2026

Valor: **R\$ 6.288.597,58**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

SÍTIO JACARANDÁ

Complemento:

Cidade: **SÃO BENEDITO**

Data de Início: 14/01/2026

Previsão de término: 04/03/2028

Bairro: **ZONA RURAL**

UF: **CE**

Nº: SN

CEP: 62370000

Coordenadas Geográficas: -4.062945, -40.906691

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO**

CPF/CNPJ: 07.778.129/0001-74

4. Atividade Técnica

16 - Execução

	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	1,00	un
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	1,00	un
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO	1,00	un
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Contratação dos serviços técnicos especializados em engenharia civil para a Construção de uma Escola de Ensino Básico no Sítio Jacarandá, Município de São Benedito/CE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

data



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha

ANTÔNIO ERISON MOREIRA DE MESQUITA

RNP: 0611605309

Data: 14/01/2026 11:32:15

ANTÔNIO ERISON MOREIRA DE MESQUITA - CPF: 042.590.513-69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CNPJ: 07.778.129/0001-74

9. Informações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A12yZ
Impresso em: 14/01/2026 às 11:32:15 por: , ip: 190.107.198.74

www.creace.org.br

Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br

Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261801599

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 285,59**

Registrada em: **14/01/2026**

Valor pago: **R\$ 285,59**

Nosso Número: **8218528929**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A12yZ
 Impresso em: 14/01/2026 às 11:32:15 por: , ip: 190.107.198.74

www.creace.org.br
 Tel: (85) 3452.5800

faleconosco@creace.org.br
 Fax: (85) 3452.5804



CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia



Contratação dos serviços técnicos especializados em engenharia civil para a
Construção de uma Escola de Ensino Básico no Sítio Jacarandá, Município de São
Benedito/CE

INÍCIO: 12/02/2028 FIM: 12/10/2027

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CONTRATO	QUANTIDADE REALIZADA NA MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	PERCENTUAL REALIZADO:
4.5.3	C/2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1 A CAT. PROF. DE 1,51 A 3,00m	M3	12,73	R\$ 80,45	0,00	0,00	12,73	12,73	100,00%
4.5.4	C/4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	1018,4	R\$ 13,83	0,00	0,00	1018,4	1018,4	100,00%
4.5.5	98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO	M2	4416	R\$ 43,49	0,00	0,00	4416	4416	100,00%
4.6	C/4592 C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	8,89	R\$ 797,01	0,00	0,00	8,89	8,89	100,00%
4.6.1	C/2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1 A CAT. PROF. DE 1,51 A 3,00m	M3	20,31	R\$ 80,45	0,00	0,00	20,31	20,31	100,00%
4.6.2	C/4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	9,02	R\$ 13,83	0,00	0,00	9,02	9,02	100,00%
4.6.3	C/4291 CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa	M3	11,35	R\$ 899,36	0,00	0,00	11,35	11,35	100,00%
4.6.4	C/4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	1018,4	R\$ 13,83	0,00	0,00	1018,4	1018,4	100,00%
4.6.5	98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO	M2	39,24	R\$ 43,49	0,00	0,00	39,24	39,24	100,00%
4.6.6	C/4592 C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	7,14	R\$ 797,01	0,00	0,00	7,14	7,14	100,00%
4.7	BLOCO B								
4.7.1	C/2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1 A CAT. PROF. DE 1,51 A 3,00m	M3	33,01	R\$ 80,45	0,00	0,00	33,01	33,01	100,00%
4.7.2	C/4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	17,28	R\$ 13,83	0,00	0,00	17,28	17,28	100,00%
4.7.3	C/4291 CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa	M3	17,28	R\$ 899,36	0,00	0,00	17,28	17,28	100,00%
4.7.4	C/4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	1380,8	R\$ 13,83	0,00	0,00	1380,8	1380,8	100,00%
4.7.5	98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO	M2	88,16	R\$ 43,49	0,00	0,00	88,16	88,16	100,00%
4.7.6	C/4592 C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	12,73	R\$ 797,01	0,00	0,00	12,73	12,73	100,00%
4.8	PATIO COBERTO								
4.8.1	C/2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1 A CAT. PROF. DE 1,51 A 3,00m	M3	9,49	R\$ 80,45	0,00	0,00	9,49	9,49	100,00%
4.8.2	C/4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	3,68	R\$ 13,83	0,00	0,00	3,68	3,68	100,00%
4.8.3	C/4291 CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa	M3	3,1	R\$ 899,36	0,00	0,00	3,1	3,1	100,00%
4.8.4	C/4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	248	R\$ 13,83	0,00	0,00	248	248	100,00%
4.8.5	98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO	M2	29,28	R\$ 43,49	0,00	0,00	29,28	29,28	100,00%
4.8.6	C/4592 C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,95	R\$ 797,01	0,00	0,00	1,95	1,95	100,00%
4.9	REFEITÓRIO								
4.9.1	C/2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1 A CAT. PROF. DE 1,51 A 3,00m	M3	9,68	R\$ 80,45	0,00	0,00	9,68	9,68	100,00%
4.9.2	C/4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	6,3	R\$ 13,83	0,00	0,00	6,3	6,3	100,00%
4.9.3	C/4291 CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa	M3	9,09	R\$ 899,36	0,00	0,00	9,09	9,09	100,00%
4.9.4	C/4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	484,8	R\$ 13,83	0,00	0,00	484,8	484,8	100,00%
4.9.5	98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO	M2	33,37	R\$ 43,49	0,00	0,00	33,37	33,37	100,00%
4.9.6	C/4592 C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	5,09	R\$ 797,01	0,00	0,00	5,09	5,09	100,00%
4.10	QUADRA POLIESPORTIVA								
4.10.1	C/2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1 A CAT. PROF. DE 1,51 A 3,00m	M3	29,39	R\$ 80,45	0,00	0,00	29,39	29,39	100,00%
4.10.2	C/4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	7,69	R\$ 13,83	0,00	0,00	7,69	7,69	100,00%
4.10.3	C/4291 CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa	M3	6,88	R\$ 899,36	0,00	0,00	6,88	6,88	100,00%
4.10.4	C/4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	550,4	R\$ 13,83	0,00	0,00	550,4	550,4	100,00%
4.10.5	98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO	M2	59,48	R\$ 43,49	0,00	0,00	59,48	59,48	100,00%
4.10.6	C/4592 C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	12,78	R\$ 797,01	0,00	0,00	12,78	12,78	100,00%
4.11	CIRCULAÇÃO								
4.11.1	C/2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1 A CAT. PROF. DE 1,51 A 3,00m	M3	49,04	R\$ 80,45	0,00	0,00	49,04	49,04	100,00%
4.11.2	C/4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	29,29	R\$ 13,83	0,00	0,00	29,29	29,29	100,00%
4.11.3	C/4291 CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa	M3	21,78	R\$ 899,36	0,00	0,00	21,78	21,78	100,00%
4.11.4	C/4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	1742,4	R\$ 13,83	0,00	0,00	1742,4	1742,4	100,00%
4.11.5	C/4592 C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	19,6	R\$ 797,01	0,00	0,00	19,6	19,6	100,00%
5.0	ESTRUTURA								
5.1	BLOCO A								
5.1.1	C/1999 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL 5X	M2	278,03	R\$ 137,33	0,00	0,00	278,03	278,03	100,00%
5.1.2	C/4391 CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa	M3	8,51	R\$ 899,36	0,00	0,00	8,51	8,51	100,00%
5.1.3	C/2016 ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	748,88	R\$ 12,73	0,00	0,00	748,88	748,88	100,00%
5.1.4	C/4200 LAJE PRE-FABRICADA TREÇUDA 10 MPa - VÃO ACIMA DE 4,81m	M2	150,56	R\$ 140,27	0,00	0,00	150,56	150,56	100,00%
5.2	BLOCO B								
5.2.1	C/1999 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL 5X	M2	181,29	R\$ 137,33	0,00	0,00	181,29	181,29	100,00%
5.2.2	C/4391 CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa	M3	5,51	R\$ 899,36	0,00	0,00	5,51	5,51	100,00%
5.2.3	C/2016 ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	484,88	R\$ 12,73	0,00	0,00	484,88	484,88	100,00%

CONTRATADA:	ME	CONTRATO Nº	MEDIÇÃO:	2ª MEDIÇÃO	ADITIVO:	VALORES (R\$)
CNPJ:	21.691.174/0001-04	2028.01.14.01	PERÍODO:	21 DE ABRIL A 30 DE JUNHO 2028	VALOR DA OBRA:	R\$ 286.597,63
VENCIMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA:	BDI: 24,62%	12/04/2028	DATA: 30/06/2026	PERCENTUAL REALIZADO:	MEDIÇÕES ACUMULADAS:	R\$ 795.460,73
					SALDO:	R\$ 5.492.136,85
					VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$ 373.831,94
						5,86%

BOLETIM DE MEDIÇÃO									
CONTRATADA:	MORERA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.-ME	CONTRATO Nº	MEDIÇÃO:	2ª MEDIÇÃO					
CNPJ:	21.691.178/0001-04	2026.01.14.01	PERÍODO:						
VENCIMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA:		12/04/2028	DATA: 30/06/2026	25 DE ABRIL A 30 DE JUNHO 2026					
		BDI: 24,52%	PERCENTUAL REALIZADO:	5,95%					
UNID	CONTRATO			QUANTIDADE REALIZADA NA MEDIÇÃO		MOVIMENTO FINANCEIRO			
	QUANT.	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL C/ BDI	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO		
M3	12,73	R\$ 899,36	R\$ 11.448,85	0,00	12,73	R\$ -	R\$ 11.448,85		
M3	1018,4	R\$ 13,83	R\$ 13.924,47	0,00	1.018,40	R\$ -	R\$ 14.084,87		
M2	4416	R\$ 43,49	R\$ 1.920,59	0,00	4416	R\$ -	R\$ 1.920,59		
M3	8,89	R\$ 797,01	R\$ 6.795,71	0,00	8,89	R\$ -	R\$ 6.795,71		
M3	20,31	R\$ 80,45	R\$ 1.633,94	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -		
M2	9,02	R\$ 81,16	R\$ 678,96	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -		
M3	11,35	R\$ 899,36	R\$ 10.204,74	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -		
M3	1018,4	R\$ 13,83	R\$ 14.084,47	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -		
M2	39,24	R\$ 43,49	R\$ 1.576,09	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -		
M3	7,14	R\$ 797,01	R\$ 5.476,45	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -		
M3	33,01	R\$ 80,45	R\$ 2.655,65	0,00	18,45	R\$ -	R\$ 1.484,30		
M2	17,28	R\$ 81,16	R\$ 1.571,60	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -		
M3	17,28	R\$ 899,36	R\$ 15.522,46	0,00	12,72	R\$ -	R\$ 11.439,86		
M2	98,16	R\$ 13,83	R\$ 19.090,63	0,00	1.017,60	R\$ -	R\$ 14.073,41		
M2	98,16	R\$ 43,49	R\$ 2.064,28	0,00	9,09	R\$ -	R\$ 6.972,12		
M3	12,73	R\$ 797,01	R\$ 9.764,04	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -		
M3	9,49	R\$ 80,45	R\$ 763,47	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -		
M2	3,68	R\$ 81,16	R\$ 335,47	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -		
M3	3,1	R\$ 899,36	R\$ 2.788,02	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -		
KG	248	R\$ 13,83	R\$ 3.429,84	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -		
M2	29,28	R\$ 43,49	R\$ 1.273,38	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -		
M3	1,95	R\$ 797,01	R\$ 1.495,67	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -		
M3	9,68	R\$ 80,45	R\$ 778,76	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -		
M2	6,3	R\$ 81,16	R\$ 574,31	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -		
M3	9,09	R\$ 899,36	R\$ 8.450,12	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -		
KG	484,8	R\$ 13,83	R\$ 6.704,78	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -		
M2	33,37	R\$ 43,49	R\$ 1.451,26	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -		
M3	5,09	R\$ 797,01	R\$ 3.904,08	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -		
M3	29,39	R\$ 80,45	R\$ 2.384,43	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -		
M2	7,69	R\$ 81,16	R\$ 701,02	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -		
M3	6,88	R\$ 899,36	R\$ 6.187,80	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -		
KG	550,4	R\$ 13,83	R\$ 7.612,03	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -		
M2	59,48	R\$ 43,49	R\$ 2.543,30	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -		
M3	12,78	R\$ 797,01	R\$ 9.892,39	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -		
M3	49,04	R\$ 80,45	R\$ 3.945,27	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -		
M2	29,29	R\$ 81,16	R\$ 2.667,34	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -		
M3	21,78	R\$ 899,36	R\$ 19.588,05	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -		
KG	1742,4	R\$ 13,83	R\$ 24.097,39	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -		
M3	19,6	R\$ 797,01	R\$ 10.431,34	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -		
M2	278,03	R\$ 137,33	R\$ 38.181,86	0,00	278,03	R\$ -	R\$ 38.181,86		
M3	8,51	R\$ 899,36	R\$ 7.653,35	0,00	8,51	R\$ -	R\$ 7.653,35		
KG	748,88	R\$ 12,73	R\$ 9.533,24	213,00	538,88	R\$ 2.711,49	R\$ 9.821,70		
M2	150,56	R\$ 40,27	R\$ 21.119,05	0,00	748,88	R\$ -	R\$ -		
M2	181,29	R\$ 137,33	R\$ 24.896,56	0,00	181,29	R\$ -	R\$ 24.896,56		
M3	5,51	R\$ 899,36	R\$ 4.956,47	0,00	5,51	R\$ -	R\$ 4.956,47		
KG	484,88	R\$ 12,73	R\$ 6.172,52	0,00	484,88	R\$ -	R\$ 6.172,52		

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			BOLETIM DE MEDIÇÃO			VALORES (R\$)		
Contratação dos serviços técnicos especializados em engenharia civil para a construção de uma Escola de Ensino Básico no Sítio Jacaranda, Município de São Benedito/CE			CONTRATADA:	CONTRATO Nº	MEDIÇÃO:	2ª MEDIÇÃO	ADITIVO:	
CNPJ:			21.691.178/0001-04	2026.01.14.01	VALOR DA OBRA:		R\$	R\$6.268.597,60
INÍCIO: 12/02/2026 FIM: 12/10/2027			BDI: 24,42%	DATA: 30/06/2026	MEDIÇÕES ACUMULADAS:		R\$	795.480,73
VENCIMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA:			12/04/2028	PERCENTUAL REALIZADO:	25 DE ABRIL A 30 DE JUNHO 2026	SALDO:	R\$	5.493.138,05
ITEM			QUANT.	UNIDADE	CONTRATO	QUANTIDADE REALIZADA NA MEDIÇÃO	MOVIMENTO FINANCEIRO (R\$)	REALIZADO / CONTRATADO (%)
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO								
7.2								
7.2.1	C0776	CHARGOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEARAR	4883,38	M2	RE 642.800,97	0,00	R\$ -	R\$ 40.686,86
7.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA	2849,1	M2	R\$ 175.618,52	0,00	R\$ -	R\$ 175.618,52
7.2.3	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA	1834,28	M2	R\$ 102.114,92	0,00	R\$ -	R\$ 102.114,92
7.2.4	C4444	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 10x10cm	1381,28	M2	R\$ 130.117,52	0,00	R\$ -	R\$ 130.117,52
7.2.5	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA	453	M2	R\$ 60.345,24	0,00	R\$ -	R\$ 60.345,24
7.2.6	C1427	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA	1834,28	M2	R\$ 13.36	0,00	R\$ -	R\$ 24.506,11
8		COBERTURA						
8.1	C1335	VÃO 10 A 15m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS)	255,08	M2	R\$ 48.558,97	0,00	R\$ -	R\$ 48.558,97
8.2	C4400	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA (RIPA, CALBRO, LINHA)	2550,32	M2	R\$ 302.238,42	0,00	R\$ -	R\$ 302.238,42
8.3	94443	ROMANA COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUI DO TRANSPORTE	2550,32	M2	R\$ 102.991,62	0,00	R\$ -	R\$ 102.991,62
8.4	C2471	TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOIS	2550,32	M2	R\$ 25,74	0,00	R\$ -	R\$ 85.845,24
8.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	1026,5	M	R\$ 17.686,07	0,00	R\$ -	R\$ 17.686,07
8.6	C0389	CUMEIEIRA CERÂMICA DA TELHA CANAL TINGIB	427,17	M	R\$ 35,00	0,00	R\$ -	R\$ 14.950,95
8.7	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP = 0,7MM	944,9	M2	R\$ 74.713,24	0,00	R\$ -	R\$ 74.713,24
8.8	C5202	CUMEIEIRA ONDULADA DE ALUMÍNIO	51,9	M	R\$ 79,07	0,00	R\$ -	R\$ 51,90
8.9	C1320	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM ARCO VÃO DE 40m	827,55	M2	R\$ 263.748,46	0,00	R\$ -	R\$ 263.748,46
8.10	C1318	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM ARCO VÃO DE 20m	147,84	M2	R\$ 260,46	0,00	R\$ -	R\$ 38.606,41
9		PISOS E PAVIMENTAÇÃO						
9.1		ESTACIONAMENTO						
9.1.1.1	C0365	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDA DO LOCAL	178,82	M	R\$ 33.718,84	0,00	R\$ -	R\$ 33.718,84
9.1.1.2	C0387	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDA DO	182,83	M	R\$ 9.387,49	0,00	R\$ -	R\$ 9.387,49
9.1.1.3	C0884	LASTRO DE PISO DE PEDRA	37,15	M2	R\$ 4.378,13	0,00	R\$ -	R\$ 4.378,13
9.1.1.4	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO EXTERNO, CTINTA BASE RESINA	153,61	M2	R\$ 27,01	0,00	R\$ -	R\$ 4.149,01
9.2		CALÇADAS E PRACHINA						
9.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT.	78,41	M3	R\$ 8.820,77	0,00	R\$ -	R\$ 8.820,77
9.2.2	C0325	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E	38,2	M3	R\$ 716,21	0,00	R\$ -	R\$ 27.359,22
9.2.3	C3450	PISO CIMENTADO ESP=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm	764,02	M2	R\$ 70,18	0,00	R\$ -	R\$ 53.618,92
9.3		PISOS GERAIS						
9.3.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E	142,27	M3	R\$ 871.811,61	0,00	R\$ -	R\$ 101.895,20
9.3.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO	2833,24	M2	R\$ 446.435,63	0,00	R\$ -	R\$ 446.435,63
9.3.3	C1123	REFINAMENTO C/ RPA, PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM	152,83	M2	R\$ 1.792,34	0,00	R\$ -	R\$ 1.792,34
9.3.4	C2285	SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm	47	M	R\$ 66,10	0,00	R\$ -	R\$ 3.106,70
9.3.5	C1914	PISO C/FORAÇÃO TEXTIL (CARPETE E 4mm)	113	M2	R\$ 50,79	0,00	R\$ -	R\$ 5.739,27
9.3.6	C4649	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL	273,2	M2	R\$ 166,31	0,00	R\$ -	R\$ 45.982,29
9.3.7	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA	152,83	M2	R\$ 106,78	0,00	R\$ -	R\$ 16.635,73
9.3.8	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	196,18	M2	R\$ 4.453,82	0,00	R\$ -	R\$ 4.453,82
9.3.9	C4616	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X9)CM 35MPa	253,54	M2	R\$ 63,89	0,00	R\$ -	R\$ 16.198,67
9.3.10	C4617	COF CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	210,88	M2	R\$ 80,32	0,00	R\$ -	R\$ 16.937,88
9.3.11	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S	198,1	M2	R\$ 61,91	0,00	R\$ -	R\$ 12.326,28
10		ESQUADRIAS						
10.1		PORTAS, GRADES E PORTÕES						
10.1.1		BLOCO A						
10.1.1.1	C1978	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA	2	UN	R\$ 1.038,80	0,00	R\$ -	R\$ 2.077,60
10.1.1.2	C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA	5	UN	R\$ 989,14	0,00	R\$ -	R\$ 4.945,70
10.1.1.3	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	19,68	M2	R\$ 270,20	0,00	R\$ -	R\$ 5.317,54

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																
Contratado dos serviços técnicos especializados em engenharia civil para a Construção de uma Escola de Ensino Básico no Sítio Jacarandá, Município de São Benedito/CE																
CONTRATADA: MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME		CONTRATO Nº 2026.01.14.01		MEDIÇÃO: 2ª MEDIÇÃO		ADITIVO: -										
CNPJ: 27.631.172/0001-34		DATA: 30/06/2026		PERÍODO: 25 DE ABRIL A 30 DE JUNHO 2026		MEDIÇÕES ACUMULADAS: R\$ 795.480,73										
VENCIMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 12/04/2028		BDI: 24,52%		PERCENTUAL REALIZADO: 5,95%		SALDO: R\$ 5.431.136,85										
INÍCIO: 12/02/2026		FIM: 12/10/2027		VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 373.931,44		5,85%										
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO				QUANTIDADE REALIZADA NA MEDIÇÃO				MOVIMENTO FINANCEIRO (R\$)				SALDO CONTRATUAL		REALIZADO / CONTRATADO (%)	
UNID.	QUANT.	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL C/ BDI	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	NO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	QUANTITATIVO	VALORES (R\$)						
11.1.12	C2359	UN	2	R\$ 28,70	R\$ 53,40	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 53,40	0,00%			
11.1.13	C2003	UN	4	R\$ 28,70	R\$ 114,80	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 284,44	0,00%			
11.1.14	C1950	PT	20	R\$ 595,11	R\$ 12.000,20	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00	R\$ 5.802,60	0,00%			
11.1.15	C2003	UN	17	R\$ 66,11	R\$ 1.123,87	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	17,00	R\$ 1.123,87	0,00%			
11.1.16	C1540	UN	2	R\$ 33,30	R\$ 66,60	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 66,60	0,00%			
11.1.17	C4398	UN	2	R\$ 22,74	R\$ 45,48	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 45,48	0,00%			
11.1.18	C2595	M	7,69	R\$ 20,41	R\$ 156,95	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	7,69	R\$ 156,95	0,00%			
11.1.19	C2832	UN	6	R\$ 31,68	R\$ 190,08	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	6,00	R\$ 30.938,84	0,00%			
11.2.1	C1528	UN	99	R\$ 13,77	R\$ 1.363,23	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	99,00	R\$ 950,13	0,00%			
11.2.2	C2391	UN	2	R\$ 10,09	R\$ 20,18	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 20,18	0,00%			
11.2.3	C1743	UN	15	R\$ 6,96	R\$ 104,40	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	15,00	R\$ 104,40	0,00%			
11.2.4	C1744	UN	18	R\$ 9,09	R\$ 163,62	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	18,00	R\$ 163,62	0,00%			
11.2.5	C1745	UN	3	R\$ 19,26	R\$ 57,78	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 57,78	0,00%			
11.2.6	C2818	M	63,95	R\$ 23,15	R\$ 1.480,44	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	63,95	R\$ 1.480,44	0,00%			
11.2.7	C2619	M	301,36	R\$ 27,13	R\$ 8.175,90	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	301,36	R\$ 8.175,90	0,00%			
11.2.8	C2621	M	134,43	R\$ 42,36	R\$ 8.383,05	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	134,43	R\$ 8.383,05	0,00%			
11.2.9	C10366	UN	3	R\$ 9,69	R\$ 29,07	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 29,07	0,00%			
11.2.10	C2381	UN	20	R\$ 12,15	R\$ 243,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00	R\$ 243,00	0,00%			
11.2.11	C2505	UN	3	R\$ 37,41	R\$ 112,23	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 112,23	0,00%			
11.2.12	C1948	PT	50	R\$ 296,45	R\$ 14.922,50	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00	R\$ 14.922,50	0,00%			
11.2.13	C4000	UN	5	R\$ 73,24	R\$ 366,20	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5,00	R\$ 366,20	0,00%			
11.2.14	C2170	UN	10	R\$ 114,18	R\$ 1.141,80	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,00	R\$ 1.141,80	0,00%			
11.2.15	C2648	UN	1	R\$ 40,64	R\$ 40,64	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 40,64	0,00%			
11.2.16	C2163	UN	1	R\$ 386,45	R\$ 386,45	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 386,45	0,00%			
11.2.17	C2161	UN	18	R\$ 175,05	R\$ 3.150,90	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	18,00	R\$ 3.150,90	0,00%			
11.2.18	C2158	UN	1	R\$ 82,96	R\$ 82,96	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 82,96	0,00%			
11.2.19	I2827	UN	28	R\$ 147,21	R\$ 3.827,48	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	28,00	R\$ 3.827,48	0,00%			
11.2.20	00012613	UN	28	R\$ 21,21	R\$ 593,88	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	28,00	R\$ 593,88	0,00%			
11.2.21	C2816	M	308,16	R\$ 10,75	R\$ 3.312,72	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	308,16	R\$ 3.312,72	0,00%			
11.2.22	C2820	M	23,47	R\$ 40,18	R\$ 843,02	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	23,47	R\$ 843,02	0,00%			
11.2.23	C2822	M	3,89	R\$ 76,22	R\$ 296,50	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3,89	R\$ 296,50	0,00%			
11.2.24	103959	E	3	R\$ 14,88	R\$ 44,64	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 44,64	0,00%			
11.2.25	103958	E	1	R\$ 10,16	R\$ 10,16	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 10,16	0,00%			
11.2.26	105234	UN	1	R\$ 9,68	R\$ 9,68	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 9,68	0,00%			
11.2.27	105140	UN	1	R\$ 24,88	R\$ 24,88	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 24,88	0,00%			
11.2.28	105141	UN	1	R\$ 29,71	R\$ 29,71	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 29,71	0,00%			
11.2.29	94673	UN	20	R\$ 7,23	R\$ 144,60	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00	R\$ 144,60	0,00%			
11.2.30	94679	UN	1	R\$ 23,11	R\$ 23,11	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 23,11	0,00%			
11.2.31	C4393	UN	1	R\$ 17,86	R\$ 17,86	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 17,86	0,00%			
11.2.32	00003335	UN	2	R\$ 5,47	R\$ 10,94	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 10,94	0,00%			
11.2.33	00003540	UN	6	R\$ 4,62	R\$ 27,72	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	6,00	R\$ 27,72	0,00%			
11.2.34	00003538	UN	1	R\$ 28,81	R\$ 28,81	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 28,81	0,00%			
11.2.35	00003509	UN	2	R\$ 6,94	R\$ 13,88	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 13,88	0,00%			
11.2.36	C2384	UN	18	R\$ 28,22	R\$ 507,96	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	18,00	R\$ 507,96	0,00%			
11.2.37	C2385	UN	1	R\$ 51,89	R\$ 51,89	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 51,89	0,00%			
11.2.38	C2387	UN	1	R\$ 112,82	R\$ 112,82	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 112,82	0,00%			
11.2.39	C2408	UN	1	R\$ 29,61	R\$ 29,61	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 29,61	0,00%			

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALORES (R\$)					
Contratação dos serviços técnicos especializados em engenharia civil para a Construção de uma Escola de Ensino Básico no Sítio Jacaranda, Município de São Benedito/CE				CONTRATADA:	INMOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME	CONTRATO Nº	MEDIÇÃO:	2ª MEDIÇÃO	ADITIVO:	R\$ -			
				CNPJ:	21.691.178/0001-04	2026.01.14.01	PERÍODO:	VALORES ACUMULADAS:	R\$ 795.460,73				
				VENCIMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA:		BDI: 24,52%	DATA: 30/06/2026	SALDO:	R\$ 5.493.138,85				
INÍCIO: 12/02/2026 FIM: 12/10/2027				PERCENTUAL REALIZADO:		5,99%		VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$ 373.331,84			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	CONTRATO			QUANTIDADE REALIZADA NA MEDIÇÃO			MOVIMENTO FINANCEIRO (R\$)			REALIZADO / CONTRATADO (%)	
			QUANT.	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL C/ BDI	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL		QUANTITATIVO
11.5.18 C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	49	R\$ 27,16	R\$ 1.330,84	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	49,00	R\$ 1.330,84	0,00%
11.5.19 I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	2	R\$ 11,00	R\$ 22,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 22,00	0,00%
11.5.20 C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	4	R\$ 34,80	R\$ 138,40	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 138,40	0,00%
11.5.21 C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	UN	2	R\$ 152,49	R\$ 304,98	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 304,98	0,00%
11.5.22 C0530	CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2	M	700,5	R\$ 26,73	R\$ 18.724,37	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	700,50	R\$ 18.724,37	0,00%
11.5.23 I1073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	M	16,11	R\$ 16,93	R\$ 272,74	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	16,11	R\$ 272,74	0,00%
11.5.24 I1068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	53,18	R\$ 10,36	R\$ 550,84	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	53,18	R\$ 550,84	0,00%
11.5.25 I1069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	M	124,52	R\$ 9,43	R\$ 1.174,22	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	124,52	R\$ 1.174,22	0,00%
11.5.26 I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	73,1	R\$ 7,09	R\$ 518,28	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	73,10	R\$ 518,28	0,00%
11.5.27 I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	530,9	R\$ 4,53	R\$ 2.404,98	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	530,90	R\$ 2.404,98	0,00%
11.5.28 C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	87	R\$ 20,58	R\$ 1.790,46	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	87,00	R\$ 1.790,46	0,00%
11.5.29 C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	23	R\$ 38,07	R\$ 875,61	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	23,00	R\$ 875,61	0,00%
11.5.30 00039471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	UN	4	R\$ 96,08	R\$ 384,32	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 384,32	0,00%
11.5.31 C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	2	R\$ 34,80	R\$ 69,20	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 69,20	0,00%
11.5.32 C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	UN	8	R\$ 34,80	R\$ 278,80	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	8,00	R\$ 278,80	0,00%
11.5.33 C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	9	R\$ 195,39	R\$ 1.488,51	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	9,00	R\$ 1.488,51	0,00%
11.5.34 C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	1	R\$ 274,98	R\$ 274,98	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 274,98	0,00%
11.5.35 C1947	PONTO ELÉTRICO AR-CONDICIONADO	PT	43	R\$ 305,54	R\$ 13.181,22	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	43,00	R\$ 13.181,22	0,00%
11.5.36 C4115	ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO	UN	24	R\$ 733,96	R\$ 17.615,04	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	24,00	R\$ 17.615,04	0,00%
11.5.37 C1838	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32W)	UN	196	R\$ 139,84	R\$ 27.408,64	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	196,00	R\$ 27.408,64	0,00%
11.5.38 C1871	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROICA 50W	UN	18	R\$ 67,65	R\$ 1.217,70	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	18,00	R\$ 1.217,70	0,00%
11.5.39 C1868	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA 02 LÂMPADAS DE 40W	UN	240	R\$ 139,84	R\$ 33.561,60	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	240,00	R\$ 33.561,60	0,00%
11.5.40 C4175	CAIXA DE PISO 47x2", EM ALUMÍNIO	UN	65	R\$ 43,07	R\$ 2.799,55	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	65,00	R\$ 2.799,55	0,00%
11.5.41 C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x60cm	UN	18	R\$ 355,90	R\$ 6.408,20	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	18,00	R\$ 6.408,20	0,00%
11.5.42 C1021	CURVA PIELETRUOTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	5	R\$ 11,11	R\$ 55,55	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5,00	R\$ 55,55	0,00%
11.5.43 C1022	CURVA PIELETRUOTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	UN	2	R\$ 15,40	R\$ 30,80	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 30,80	0,00%
11.5.44 C1023	CURVA PIELETRUOTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	UN	2	R\$ 19,08	R\$ 38,16	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 38,16	0,00%
11.5.45 C1710	LUVA PIELETRUOTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	10	R\$ 4,32	R\$ 43,20	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,00	R\$ 43,20	0,00%
11.5.46 C1711	LUVA PIELETRUOTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	UN	4	R\$ 6,33	R\$ 25,32	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 25,32	0,00%
11.5.47 C1712	LUVA PIELETRUOTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	UN	4	R\$ 8,34	R\$ 33,36	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 33,36	0,00%
11.6	COMBATE AO INCENDIO				R\$ 4.837,64								
11.6.1 101809	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020 PE	UN	9	R\$ 318,32	R\$ 2.864,88	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	9,00	R\$ 2.864,88	0,00%
11.6.2 97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2024	UN	59	R\$ 19,43	R\$ 1.146,37	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	59,00	R\$ 1.146,37	0,00%
11.6.3 C3388	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	0,9	R\$ 917,54	R\$ 825,79	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,90	R\$ 825,79	0,00%
11.7	DRENAAGEM				R\$ 21.063,98								
11.7.1 C0936	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TUBO COMUM	M2	5	R\$ 180,45	R\$ 902,25	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5,00	R\$ 902,25	0,00%
11.7.2 C2564	TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=100mm (4") - JUNTA CANELAS	M	430	R\$ 45,51	R\$ 19.569,30	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	430,00	R\$ 19.569,30	0,00%
11.7.3 C4645	CHUVA DE ALVENARIA - REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x60cm	UN	1	R\$ 542,43	R\$ 542,43	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 542,43	0,00%
12.0	PINTURA				R\$ 17.185,63								
12.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CINZA DE PVA				R\$ 6.581,19								
12.1.1 C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CINZA DE PVA	M2	1385,13	R\$ 15,54	R\$ 21.214,12	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.385,13	R\$ 21.214,12	0,00%
12.1.2 C1915	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS CINZA	M2	1385,13	R\$ 25,04	R\$ 34.182,86	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.385,13	R\$ 34.182,86	0,00%
12.2	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CINZA DE PVA				R\$ 6.581,19								
12.2.1 C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CINZA DE PVA	M2	423,5	R\$ 15,54	R\$ 6.581,19	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	423,50	R\$ 6.581,19	0,00%

Contratação dos serviços técnicos especializados em engenharia civil para a
Construção de uma Escola de Ensino Básico no Sítio Jacarandá, Município de São
Benedito/CE

INÍCIO: 12/02/2026 FIM: 12/10/2027

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	CONTRATO C/ BDI	TOTAL C/ BDI	QUANTIDADE REALIZADA NA MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	QUANTITATIVO	VALORES (R\$)	REALIZADO / CONTRATADO (%)
12.2.2	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS SM/SSA BLOCO B	M2	423,5	R\$ 25,04	R\$ 10.604,44	0,00								
12.3	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOIS C/SSA DE PVA	M2	271,87	R\$ 15,54	R\$ 4.226,41	0,00								
12.3.1	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS SM/SSA	M2	271,87	R\$ 25,04	R\$ 6.810,13	0,00								
12.3.2	PINTURA ARTÍSTICA EM PAREDES COM TINTA LATEX (M2)	M2	187,8	R\$ 90,31	R\$ 16.960,22	0,00								
12.3.3	BLOCO C													
12.4	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOIS C/SSA DE PVA	M2	256,7	R\$ 15,54	R\$ 4.020,20	0,00								
12.4.1	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS SM/SSA	M2	256,7	R\$ 25,04	R\$ 6.477,85	0,00								
12.4.2	BLOCO D													
12.5	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOIS C/SSA DE PVA	M2	378,86	R\$ 15,54	R\$ 5.887,48	0,00								
12.5.1	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS SM/SSA	M2	378,86	R\$ 25,04	R\$ 9.486,65	0,00								
12.5.2	BLOCO E													
12.6	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOIS C/SSA DE PVA	M2	378,86	R\$ 15,54	R\$ 5.887,48	0,00								
12.6.1	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS SM/SSA	M2	378,86	R\$ 25,04	R\$ 9.486,65	0,00								
12.6.2	BLOCO F													
12.7	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOIS C/SSA DE PVA	M2	136,8	R\$ 15,54	R\$ 2.125,87	0,00								
12.7.1	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS SM/SSA	M2	136,8	R\$ 25,04	R\$ 3.425,47	0,00								
12.7.2	BLOCO G													
12.8	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOIS C/SSA DE PVA	M2	405,49	R\$ 15,54	R\$ 6.301,31	0,00								
12.8.1	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS SM/SSA	M2	405,49	R\$ 25,04	R\$ 10.153,47	0,00								
12.8.2	BLOCO H													
12.9	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA OLEO QUERSMALTE 2 DEMÃOIS	M2	144,48	R\$ 21,24	R\$ 3.068,76	0,00								
12.9.1	ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	117,86	R\$ 52,82	R\$ 6.223,37	0,00								
12.9.2	ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	144,48	R\$ 26,59	R\$ 4.130,69	0,00								
12.9.3	REFEITÓRIO													
12.10	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOIS C/SSA DE PVA	M2	47,85	R\$ 15,54	R\$ 743,59	0,00								
12.10.1	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS SM/SSA	M2	47,85	R\$ 25,04	R\$ 1.194,16	0,00								
12.10.2	FACHADA													
12.11	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOIS C/SSA DE PVA	M2	50	R\$ 15,54	R\$ 777,00	0,00								
12.11.1	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS SM/SSA	M2	50	R\$ 25,04	R\$ 1.252,00	0,00								
12.11.2	PINTURA ARTÍSTICA EM PAREDES COM TINTA LATEX (M2)	M2	78,3	R\$ 90,31	R\$ 7.071,27	0,00								
12.11.3	COFES													
12.12	DEP. DE URE E GAS													
12.12.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOIS C/SSA DE PVA	M2	20,33	R\$ 15,54	R\$ 315,93	0,00								
12.12.2	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS SM/SSA	M2	20,33	R\$ 25,04	R\$ 509,06	0,00								
12.13.1	PINTURA DA QUADRA													
12.13.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOIS C/SSA DE PVA	M2	682,22	R\$ 15,54	R\$ 10.601,70	0,00								
12.13.2	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS SM/SSA	M2	682,22	R\$ 25,04	R\$ 17.082,79	0,00								
13.0	RESERVATÓRIO ELEVADO													
13.1	RECONSTRUÇÃO DE VÃO COM PISO DE CIMENTO													
13.1.1	MONTANTE E JUSANTEIURA COMPOSIÇÃO POR CIMENTO	M3	10,61	R\$ 11,54	R\$ 122,44	0,00								
13.1.2	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM TUBO DE 1,5 M E MENOR DE 2,5 M ACERTO DO SOLA NATURAL	M2	7,07	R\$ 3,86	R\$ 27,29	0,00								
13.1.3	CEMENTO PORTLAND COM TUBO DE 1,5 M E MENOR DE 2,5 M ACERTO DO SOLA NATURAL	M2	0,41	R\$ 431,31	R\$ 178,84	0,00								
13.1.4	SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO 1) - PREPARO 2) - PREPARO 3) - PREPARO 4) - PREPARO 5) - PREPARO 6) - PREPARO 7) - PREPARO 8) - PREPARO 9) - PREPARO 10) - PREPARO 11) - PREPARO 12) - PREPARO 13) - PREPARO 14) - PREPARO 15) - PREPARO 16) - PREPARO 17) - PREPARO 18) - PREPARO 19) - PREPARO 20) - PREPARO 21) - PREPARO 22) - PREPARO 23) - PREPARO 24) - PREPARO 25) - PREPARO 26) - PREPARO 27) - PREPARO 28) - PREPARO 29) - PREPARO 30) - PREPARO 31) - PREPARO 32) - PREPARO 33) - PREPARO 34) - PREPARO 35) - PREPARO 36) - PREPARO 37) - PREPARO 38) - PREPARO 39) - PREPARO 40) - PREPARO 41) - PREPARO 42) - PREPARO 43) - PREPARO 44) - PREPARO 45) - PREPARO 46) - PREPARO 47) - PREPARO 48) - PREPARO 49) - PREPARO 50) - PREPARO 51) - PREPARO 52) - PREPARO 53) - PREPARO 54) - PREPARO 55) - PREPARO 56) - PREPARO 57) - PREPARO 58) - PREPARO 59) - PREPARO 60) - PREPARO 61) - PREPARO 62) - PREPARO 63) - PREPARO 64) - PREPARO 65) - PREPARO 66) - PREPARO 67) - PREPARO 68) - PREPARO 69) - PREPARO 70) - PREPARO 71) - PREPARO 72) - PREPARO 73) - PREPARO 74) - PREPARO 75) - PREPARO 76) - PREPARO 77) - PREPARO 78) - PREPARO 79) - PREPARO 80) - PREPARO 81) - PREPARO 82) - PREPARO 83) - PREPARO 84) - PREPARO 85) - PREPARO 86) - PREPARO 87) - PREPARO 88) - PREPARO 89) - PREPARO 90) - PREPARO 91) - PREPARO 92) - PREPARO 93) - PREPARO 94) - PREPARO 95) - PREPARO 96) - PREPARO 97) - PREPARO 98) - PREPARO 99) - PREPARO 100) - PREPARO 101) - PREPARO 102) - PREPARO 103) - PREPARO 104) - PREPARO 105) - PREPARO 106) - PREPARO 107) - PREPARO 108) - PREPARO 109) - PREPARO 110) - PREPARO 111) - PREPARO 112) - PREPARO 113) - PREPARO 114) - PREPARO 115) - PREPARO 116) - PREPARO 117) - PREPARO 118) - PREPARO 119) - PREPARO 120) - PREPARO 121) - PREPARO 122) - PREPARO 123) - PREPARO 124) - PREPARO 125) - PREPARO 126) - PREPARO 127) - PREPARO 128) - PREPARO 129) - PREPARO 130) - PREPARO 131) - PREPARO 132) - PREPARO 133) - PREPARO 134) - PREPARO 135) - PREPARO 136) - PREPARO 137) - PREPARO 138) - PREPARO 139) - PREPARO 140) - PREPARO 141) - PREPARO 142) - PREPARO 143) - PREPARO 144) - PREPARO 145) - PREPARO 146) - PREPARO 147) - PREPARO 148) - PREPARO 149) - PREPARO 150) - PREPARO 151) - PREPARO 152) - PREPARO 153) - PREPARO 154) - PREPARO 155) - PREPARO 156) - PREPARO 157) - PREPARO 158) - PREPARO 159) - PREPARO 160) - PREPARO 161) - PREPARO 162) - PREPARO 163) - PREPARO 164) - PREPARO 165) - PREPARO 166) - PREPARO 167) - PREPARO 168) - PREPARO 169) - PREPARO 170) - PREPARO 171) - PREPARO 172) - PREPARO 173) - PREPARO 174) - PREPARO 175) - PREPARO 176) - PREPARO 177) - PREPARO 178) - PREPARO 179) - PREPARO 180) - PREPARO 181) - PREPARO 182) - PREPARO 183) - PREPARO 184) - PREPARO 185) - PREPARO 186) - PREPARO 187) - PREPARO 188) - PREPARO 189) - PREPARO 190) - PREPARO 191) - PREPARO 192) - PREPARO 193) - PREPARO 194) - PREPARO 195) - PREPARO 196) - PREPARO 197) - PREPARO 198) - PREPARO 199) - PREPARO 200) - PREPARO 201) - PREPARO 202) - PREPARO 203) - PREPARO 204) - PREPARO 205) - PREPARO 206) - PREPARO 207) - PREPARO 208) - PREPARO 209) - PREPARO 210) - PREPARO 211) - PREPARO 212) - PREPARO 213) - PREPARO 214) - PREPARO 215) - PREPARO 216) - PREPARO 217) - PREPARO 218) - PREPARO 219) - PREPARO 220) - PREPARO 221) - PREPARO 222) - PREPARO 223) - PREPARO 224) - PREPARO 225) - PREPARO 226) - PREPARO 227) - PREPARO 228) - PREPARO 229) - PREPARO 230) - PREPARO 231) - PREPARO 232) - PREPARO 233) - PREPARO 234) - PREPARO 235) - PREPARO 236) - PREPARO 237) - PREPARO 238) - PREPARO 239) - PREPARO 240) - PREPARO 241) - PREPARO 242) - PREPARO 243) - PREPARO 244) - PREPARO 245) - PREPARO 246) - PREPARO 247) - PREPARO 248) - PREPARO 249) - PREPARO 250) - PREPARO 251) - PREPARO 252) - PREPARO 253) - PREPARO 254) - PREPARO 255) - PREPARO 256) - PREPARO 257) - PREPARO 258) - PREPARO 259) - PREPARO 260) - PREPARO 261) - PREPARO 262) - PREPARO 263) - PREPARO 264) - PREPARO 265) - PREPARO 266) - PREPARO 267) - PREPARO 268) - PREPARO 269) - PREPARO 270) - PREPARO 271) - PREPARO 272) - PREPARO 273) - PREPARO 274) - PREPARO 275) - PREPARO 276) - PREPARO 277) - PREPARO 278) - PREPARO 279) - PREPARO 280) - PREPARO 281) - PREPARO 282) - PREPARO 283) - PREPARO 284) - PREPARO 285) - PREPARO 286) - PREPARO 287) - PREPARO 288) - PREPARO 289) - PREPARO 290) - PREPARO 291) - PREPARO 292) - PREPARO 293) - PREPARO 294) - PREPARO 295) - PREPARO 296) - PREPARO 297) - PREPARO 298) - PREPARO 299) - PREPARO 300) - PREPARO 301) - PREPARO 302) - PREPARO 303) - PREPARO 304) - PREPARO 305) - PREPARO 306) - PREPARO 307) - PREPARO 308) - PREPARO 309) - PREPARO 310) - PREPARO 311) - PREPARO 312) - PREPARO 313) - PREPARO 314) - PREPARO 315) - PREPARO 316) - PREPARO 317) - PREPARO 318) - PREPARO 319) - PREPARO 320) - PREPARO 321) - PREPARO 322) - PREPARO 323) - PREPARO 324) - PREPARO 325) - PREPARO 326) - PREPARO 327) - PREPARO 328) - PREPARO 329) - PREPARO 330) - PREPARO 331) - PREPARO 332) - PREPARO 333) - PREPARO 334) - PREPARO 335) - PREPARO 336) - PREPARO 337) - PREPARO 338) - PREPARO 339) - PREPARO 340) - PREPARO 341) - PREPARO 342) - PREPARO 343) - PREPARO 344) - PREPARO 345) - PREPARO 346) - PREPARO 347) - PREPARO 348) - PREPARO 349) - PREPARO 350) - PREPARO 351) - PREPARO 352) - PREPARO 353) - PREPARO 354) - PREPARO 355) - PREPARO 356) - PREPARO 357) - PREPARO 358) - PREPARO 359) - PREPARO 360) - PREPARO 361) - PREPARO 362) - PREPARO 363) - PREPARO 364) - PREPARO 365) - PREPARO 366) - PREPARO 367) - PREPARO 368) - PREPARO 369) - PREPARO 370) - PREPARO 371) - PREPARO 372) - PREPARO 373) - PREPARO 374) - PREPARO 375) - PREPARO 376) - PREPARO 377) - PREPARO 378) - PREPARO 379) - PREPARO 380) - PREPARO 381) - PREPARO 382) - PREPARO 383) - PREPARO 384) - PREPARO 385) - PREPARO 386) - PREPARO 387) - PREPARO 388) - PREPARO 389) - PREPARO 390) - PREPARO 391) - PREPARO 392) - PREPARO 393) - PREPARO 394) - PREPARO 395) - PREPARO 396) - PREPARO 397) - PREPARO 398) - PREPARO 399) - PREPARO 400) - PREPARO 401) - PREPARO 402) - PREPARO 403) - PREPARO 404) - PREPARO 405) - PREPARO 406) - PREPARO 407) - PREPARO 408) - PREPARO 409) - PREPARO 410) - PREPARO 411) - PREPARO 412) - PREPARO 413) - PREPARO 414) - PREPARO 415) - PREPARO 416) - PREPARO 417) - PREPARO 418) - PREPARO 419) - PREPARO 420) - PREPARO 421) - PREPARO 422) - PREPARO 423) - PREPARO 424) - PREPARO 425) - PREPARO 426) - PREPARO 427) - PREPARO 428) - PREPARO 429) - PREPARO 430) - PREPARO 431) - PREPARO 432) - PREPARO 433) - PREPARO 434) - PREPARO 435) - PREPARO 436) - PREPARO 437) - PREPARO 438) - PREPARO 439) - PREPARO 440) - PREPARO 441) - PREPARO 442) - PREPARO 443) - PREPARO 444) - PREPARO 445) - PREPARO 446) - PREPARO 447) - PREPARO 448) - PREPARO 449) - PREPARO 450) - PREPARO 451) - PREPARO 452) - PREPARO 453) - PREPARO 454) - PREPARO 455) - PREPARO 456) - PREPARO 457) - PREPARO 458) - PREPARO 459) - PREPARO 460) - PREPARO 461) - PREPARO 462) - PREPARO 463) - PREPARO 464) - PREPARO 465) - PREPARO 466) - PREPARO 467) - PREPARO 468) - PREPARO 469) - PREPARO 470) - PREPARO 471) - PREPARO 472) - PREPARO 473) - PREPARO 474) - PREPARO 475) - PREPARO 476) - PREPARO 477) - PREPARO 478) - PREPARO 479) - PREPARO 480) - PREPARO 481) - PREPARO 482) - PREPARO 483) - PREPARO 484) - PREPARO 485) - PREPARO 486) - PREPARO 487) - PREPARO 488) - PREPARO 489) - PREPARO 490) - PREPARO 491) - PREPARO 492) - PREPARO 493) - PREPARO 494) - PREPARO 495) - PREPARO 496) - PREPARO 497) - PREPARO 498) - PREPARO 499) - PREPARO 500) - PREPARO 501) - PREPARO 502) - PREPARO 503) - PREPARO 504) - PREPARO 505) - PREPARO 506) - PREPARO 507) - PREPARO 508) - PREPARO 509) - PREPARO 510) - PREPARO 511) - PREPARO 512) - PREPARO 513) - PREPARO 514) - PREPARO 515) - PREPARO 516) - PREPARO 517) - PREPARO 518) - PREPARO 519) - PREPARO 520) - PREPARO 521) - PREPARO 522) - PREPARO 523) - PREPARO 524) - PREPARO 525) - PREPARO 526) - PREPARO 527) - PREPARO 528) - PREPARO 529) - PREPARO 530) - PREPARO 531) - PREPARO 532) - PREPARO 533) - PREPARO 534) - PREPARO 535) - PREPARO 536) - PREPARO 537) - PREPARO 538) - PREPARO 539) - PREPARO 540) - PREPARO 541) - PREPARO 542) - PREPARO 543) - PREPARO 544) - PREPARO 545) - PREPARO 546) - PREPARO 547) - PREPARO 548) - PREPARO 549) - PREPARO 550) - PREPARO 551) - PREPARO 552) - PREPARO 553) - PREPARO 554) - PREPARO 555) - PREPARO 556) - PREPARO 557) - PREPARO 558) - PREPARO 559) - PREPARO 560) - PREPARO 561) - PREPARO 562) - PREPARO 563) - PREPARO 564) - PREPARO 565) - PREPARO 566) - PREPARO 567) - PREPARO 568) - PREPARO 569) - PREPARO 570) - PREPARO 571) - PREPARO 572) - PREPARO 573) - PREPARO 574) - PREPARO 575) - PREPARO 576) - PREPARO 577) - PREPARO 578) - PREPARO 579) - PREPARO 580) - PREPARO 581) - PREPARO 582) - PREPARO 583) - PREPARO 584) - PREPARO 585) - PREPARO 586) - PREPARO 587) - PREPARO 588) - PREPARO 589) - PREPARO 590) - PREPARO 591) - PREPARO 592) - PREPARO 593) - PREPARO 594) - PREPARO 595) - PREPARO 596) - PREPARO 597) - PREPARO 598) - PREPARO 599) - PREPARO 600) - PREPARO 601) - PREPARO 602) - PREPARO 603) - PREPARO 604) - PREPARO 605) - PREPARO 606) - PREPARO 607) - PREPARO 608) - PREPARO 609) - PREPARO 610) - PREPARO 611) - PREPARO 612) - PREPARO 613) - PREPARO 614) - PREPARO 615) - PREPARO 616) - PREPARO 617) - PREPARO 618) - PREPARO 619) - PREPARO 620) - PREPARO 621) - PREPARO 622) - PREPARO 623) - PREPARO 624) - PREPARO 625) - PREPARO 626) - PREPARO 627) - PREPARO 628) - PREPARO 629) - PREPARO 630) - PREPARO 631) - PREPARO 632) - PREPARO 633) - PREPARO 634) - PREPARO 635) - PREPARO 636) - PREPARO 637) - PREPARO 638) - PREPARO 639) - PREPARO 640) - PREPARO 641) - PREPARO 642) - PREPARO 643) - PREPARO 644) - PREPARO 645) - PREPARO 646) - PREPARO 647) - PREPARO 648) - PREPARO 649) - PREPARO 650) - PREPARO 651) - PREPARO 652) - PREPARO 653) - PREPARO 654) - PREPARO 655) - PREPARO 656) - PREPARO 657) - PREPARO 658) - PREPARO 659) - PREPARO 660) - PREPARO 661) - PREPARO 662) - PREPARO 663) - PREPARO 664) - PREPARO 665) - PREPARO 666) - PREPARO 667) - PREPARO 668) - PREPARO 669) - PREPARO 670) - PREPARO 671) - PREPARO 672) - PREPARO 673) - PREPARO 674) - PREPARO 675) - PREPARO 676) - PREPARO 677) - PREPARO 678) - PREPARO 679) - PREPARO 680) - PREPARO 681) - PREPARO 682) - PREPARO 683) - PREPARO 684) - PREPARO 685) - PREPARO 686) - PREPARO 687) - PREPARO 688) - PREPARO 689) - PREPARO 690) - PREPARO 691) - PREPARO 692) - PREPARO 693) - PREPARO 694) - PREPARO 695) - PREPARO 696) - PREPARO 697) - PREPARO 698) - PREPARO 699) - PREPARO 700) - PREPARO 701) - PREPARO 702) - PREPARO 703) - PREPARO 704) - PREPARO 705) - PREPARO 706) - PREPARO 707) - PREPARO 708) - PREPARO 709) - PREPARO 710) - PREPARO 711) - PREPARO 712) - PREPARO 713) - PREPARO 714) - PREPARO 715) - PREPARO 716) - PREPARO 717) - PREPARO 718) - PREPARO 719) - PREPARO 720) - PREPARO 721) - PREPARO 722) - PREPARO 723) - PREPARO 724) - PREPARO 725) - PREPARO 726) - PREPARO 727) - PREPARO 728) - PREPARO 729) - PREPARO 730) - PREPARO 731) - PREPARO 732) - PREPARO 733) - PREPARO 734) - PREPARO 735) - PREPARO 736) - PREPARO 737) - PREPARO 738) - PREPARO 739) - PREPARO 740) - PREPARO 741) - PREPARO 742) - PREPARO 743) - PREPARO 744) - PREPARO 745) - PREPARO 746) - PREPARO 747) - PREPARO 748) - PREPARO 749) - PREPARO 750) - PREPARO 751) - PREPARO 752) - PREPARO 753) - PREPARO 754) - PREPARO 755) - PREPARO 756) - PREPARO 757) - PREPARO 758) - PREPARO 759) - PREPARO 760) - PREPARO 761) - PREPARO 762) - PREPARO 763) - PREPARO 764) - PREPARO 765) - PREPARO 766) - PREPARO 767) - PREPARO 768) - PREPARO 769) - PREPARO 770) - PREPARO 771) - PREPARO 772) - PREPARO 773) - PREPARO 774) - PREPARO 775) - PREPARO 776) - PREPARO 777) - PREPARO 778) - PREPARO 779) - PREPARO 780) - PREPARO 781) - PREPARO 782) - PREPARO 783) - PREPARO 784) - PREPARO 785) - PREPARO 786) - PREPARO 787) - PREPARO 788) - PREPARO 789) - PREPARO 790) - PREPARO 791) - PREPARO 792) - PREPARO 793) - PREPARO 794) - PREPARO 795) - PREPARO 796) - PREPARO 797) - PREPARO 798) - PREPARO 799) - PREPARO 800) - PREPARO 801) - PREPARO 802) - PREPARO 803) - PREPARO 804) - PREPARO 805) - PREPARO 806) - PREPARO 807) - PREPARO 808) - PREPARO 809) - PREPARO 810) - PREPARO 811) - PREPARO 812) - PREPARO 813) - PREPARO 814) - PREPARO 815) - PREPARO 816) - PREPARO 817) - PREPARO 818) - PREPARO 819) - PREPARO 820) - PREPARO 821) - PREPARO 822) - PREPARO 823) - PREPARO 824) - PREPARO 825) - PREPARO 826) - PREPARO 827) - PREPARO 828) - PREPARO 829) - PREPARO 830) - PREPARO 831) - PREPARO 832) - PREPARO 833) -													

 São Benedito	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	MEMORIAL DE CÁLCULO		VALORES (R\$)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO					
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2º MEDIÇÃO		CONTRATO:	R\$6.288.597,58
Contratação dos serviços técnicos especializados em engenharia civil para a Construção de uma Escola de Ensino Básico no Sítio Jacarandá, Município de São Benedito/CE		CONTRATADA:	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME	ADITIVO:	R\$ -
		CNPJ:	21.691.178/0001-04	MEDIÇÕES ACUMULADAS:	R\$ 795.460,73
		CONTRATO Nº:	2026.01.14.01	SALDO:	R\$ 5.493.136,85
		DATA:	30/09/2026	PERCENTUAL REALIZADO:	12,65%
INICIO: 12/02/2026 FIM: 12/10/2027					

1.3. LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

LOCAÇÃO DA OBRA	A	QTD
A	652,44000000	652,44
		652,44

2.1. ADM.24 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%MÊS)

PERÍODO DA OBRA	MÊS	QTD
	1,00	1,00
		1,00

3.1.2 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

	A	H	QTD
BLOCO B	A'H	181,00	1,20
BLOCO E	A'H	258,50	1,00
BLOCO D	A'H	258,50	1,00
			734,20

3.2.1. ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) (M3)

MURO DE CONTENÇÃO DE ATERRO	P	H	L	QTD
	56,34000000	2,00000000	0,30000000	33,80
				33,80

4.2.2. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

VIGAS BALDRAMES	C	UT	H	QNT	QTD
VIGAS BALDRAMES	C'1'1'QNT'UT	54,30000000	0,00000000	0,00000000	2,17
SAPATAS PILARES P1	C'1'1'QNT'UT	1,00000000	0,00000000	11,00000000	2,38
SAPATAS PILARES P2	C'1'1'QNT'UT	1,00000000	0,00000000	22,00000000	4,22
					8,77

4.2.3. C4291 CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA (M3)

SAPATAS PILARES P1	C	H	L	QNT	QTD
SAPATAS PILARES P1	C'1'1'QNT'UT	0,40000000	0,00000000	0,00000000	1,88
SAPATAS PILARES P2	C'1'1'QNT'UT	0,50000000	0,00000000	27,00000000	5,38
VIGA BALDRAME	C'1'1'QNT'UT	54,30000000	0,00000000	0,00000000	2,17
					9,03

4.2.4. C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

		TX	V	QTD
ARMADURA	V'1'X	58,00000000	9,00000000	723,45
				723,45

4.2.5. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

		P	C	QTD
IMPERMEABILIZAÇÃO DA VIGA BALDRAME	P'C	54,30000000	0,00000000	32,58
				32,58

4.2.6. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

		H	L	P	QNT	QTD
BALDRAME PAREDES	P'H'L'QNT	0,40000000	0,20000000	04,00000000	1,00000000	4,3
PATIO	P'H'L'QNT	0,20000000	0,20000000	01,00000000	1,00000000	2,1
						6,40

4.4.1. C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. DE 1,51 a 3,00m (M3)

		C	H	L	QNT	QTD
ESCAVAÇÃO PILARES P1	C'1'1'QNT	0,50000000	0,70000000	0,40000000	16,00000000	3,78
ESCAVAÇÃO PILARES P2	C'1'1'QNT	0,40000000	0,70000000	0,40000000	30,00000000	5,04
ESCAVAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES	C'1'1'QNT	73,05000000	0,20000000	0,30000000	1,50000000	4,42
BALDRAME PÁTIO	C'1'1'QNT	74,30000000	0,40000000	0,40000000	1,50000000	11,87
						25,11

4.4.2. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

		C	UT	H	QNT	QTD
VIGAS BALDRAMES	C'1'1'QNT'UT	73,60000000	5,50000000	0,20000000	1,00000000	2,84
SAPATAS PILARES P1	C'1'1'QNT'UT	1,80000000	2,05000000	0,60000000	18,00000000	3,89
SAPATAS PILARES P2	C'1'1'QNT'UT	1,60000000	5,00000000	0,60000000	30,00000000	5,78
						12,51

4.4.3. C4291 CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA (M3)

C	H	L	QNT	QTD
---	---	---	-----	-----

DAVID DE SOUSA
FERNANDES:96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353
MÉ: C=BR, O=C=BR, OU=AC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353
Data: 2023.07.08 09:58:25-0300
Fonte: PDF Fielix Versão: 2023.2.1

ANTONIO ERISON
MOREIRA DE
MESQUITA:04259051369

Assinado de forma
digital por ANTONIO
ERISON MOREIRA DE
MESQUITA:04259051
369



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALORES (R\$)

2º MEDIÇÃO

R\$6.288.597.58

Contratação dos serviços técnicos especializados em engenharia civil para a Construção de uma Escola de Ensino Básico no Sítio Jacarandá, Município de São

Benedito/CE

INICIO: 12/02/2026 FIM: 12/10/2027

CONTRATUAL:	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA-ME
CNPJ:	21.691.178/0001-04
CONTRATO N°:	2026.01.14.01
DATA:	30/06/2026

CONTRATO:	R\$6.288.597,56
ADITIVO	R\$ -
MEDIÇÕES ACUMULADAS:	R\$ 795.460,73
SALDO:	R\$ 5.493.136,85

[illegible]

PERCENTUAL REALIZADO:	12,65%
-----------------------	--------

PERCENTUAL REALIZADO:										12,65%
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	VALORES DE CONTRATO (R\$)	MOVIMENTO FINANCEIRO (R\$) / PERCENTUAL REALIZADO NO PERÍODO (%)					SALDO CONTRATUAL (R\$)	REALIZADO / CONTRATADO (%)	
			Medição	1º Medição	2º Medição		ACUMULADO ATUAL			
			Mês							
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 372.245,26	(R\$) (%)	R\$ 246.461,11	R\$ 5.539,22	R\$ 1,49%	R\$ 252.000,33	R\$ 120.244,83	67,70%	
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 144.566,40	(R\$) (%)	R\$ 14.466,64	R\$ 7.233,32	R\$ 5,00%	R\$ 21.699,96	R\$ 122.966,44	15,00%	
03	MOVIMENTAÇÃO E CONTENÇÃO DE TERRA	R\$ 866.913,50	(R\$) (%)	R\$ 110.413,75	R\$ 80.695,92	R\$ 9,31%	R\$ 191.109,67	R\$ 675.803,83	22,04%	
04	FUNDAÇÕES	R\$ 383.724,01	(R\$) (%)	R\$ 41.207,05	R\$ 134.116,34	R\$ 34,95%	R\$ 175.325,39	R\$ 208.398,62	45,69%	
05	ESTRUTURA	R\$ 678.320,70	(R\$) (%)	R\$ 2.711,49	R\$ 88.681,95	R\$ 13,07%	R\$ 91.393,15	R\$ 586.927,55	13,47%	
06	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 231.461,03	(R\$) (%)	R\$ 6.268,75	R\$ 57.663,48	R\$ 24,91%	R\$ 63.932,23	R\$ 167.528,80	27,62%	
07	REVESTIMENTOS	R\$ 633.455,00	(R\$) (%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 633.455,00		
08	COBERTURA	R\$ 934.625,26	(R\$) (%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 934.625,26		
09	PISOS E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 786.029,36	(R\$) (%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 786.029,36		
10	ESQUADRAS	R\$ 183.347,45	(R\$) (%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 183.347,45		
11	INSTALAÇÕES	R\$ 746.449,30	(R\$) (%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 746.449,30		
12	PINTURA	R\$ 216.808,11	(R\$) (%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 216.808,11		
13	RESERVATÓRIO ELEVADO	R\$ 74.308,86	(R\$) (%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.308,86		
14	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 37.243,33	(R\$) (%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.243,33		
TOTAL SEM BDI			R\$	6.288.597,56	R\$	421.528,79	R\$	373.931,94	12,65%	
VALOR TOTAL COM BDI - 24,52%			R\$	6.288.597,56	R\$	421.528,79	R\$	373.931,94	12,65%	

DAVID DE SOUSA
FERNANDES:9681205

Assinado eletronicamente por DAVID DE SOLLA PERMANENTE-9184.1263233
 NO: C-89, Q-20-CE-Brasil, Q-CE SOLITA Maricao 15, Q-CE-302006000120
 Q-CE-ViscondeCervantes, Q-CE-Certificado PE A1, CN=DAVID DE SOLLA
 PERMANENTE-9681812632333
 Prazo: 150 dias e/ou maior dentro do documento
 Local: 302006000120
 Data: 2025.07.25 05:25:25-03'00'
 Para: QCE-Editor Verifica 2025.2.1

ANTONIO ERISON
MOREIRA DE
MESQUITA:04259

Assinado de forma digital por
ANTONIO ERISON MOREIRA DE
MESQUITA:04259051369


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contratação dos serviços técnicos especializados em engenharia civil para a Construção de uma Escola de Ensino Básico no Sítio Jacarandá, Município de São Benedito/CE	CONTRATADA:	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME		
	CNPJ:	21.691.178/0001-04		
	2º MEDIÇÃO		VALOR	R\$ 373.931,94
INICIO: 12/02/2026 FIM: 12/10/2027	DATA:	30 DE JUNHO DE 2026		


FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS E ALVENARIAS DOS BLOCOS A, B, D, E



ESTRUTURA E ALVENARIA BLOCO A

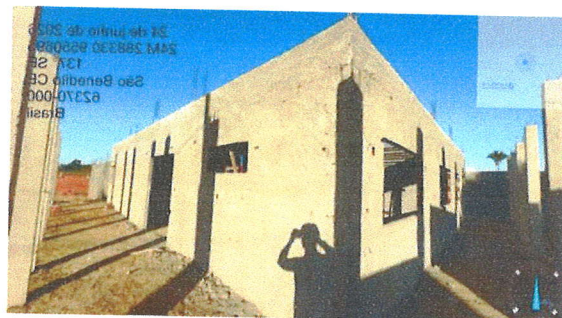


ESTRUTURA E ALVENARIA BLOCO A

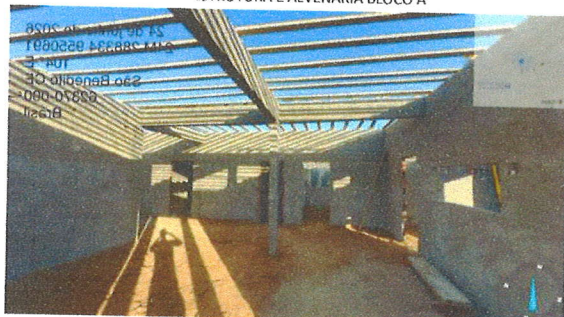


ESTRUTURA E ALVENARIA BLOCO A



ESTRUTURA E ALVENARIA BLOCO A

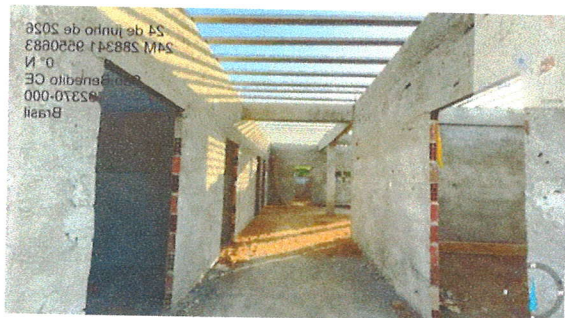

ESTRUTURA E ALVENARIA BLOCO A

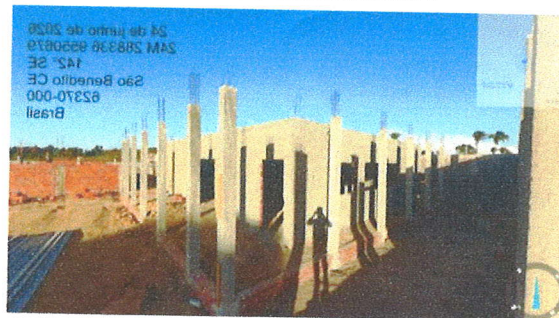


FUNDAÇÕES, ESTRUTURA E ALVENARIA BLOCO B

ANTONIO ERISON
MOREIRA DE
MESQUITA:0425905
1369

Assinado de forma
digital por ANTONIO
ERISON MOREIRA DE
MESQUITA:04259051369

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


Contratação dos serviços técnicos especializados em engenharia civil para a Construção de uma Escola de Ensino Básico no Sítio Jacarandá, Município de São Benedito/CE	CONTRATADA:	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME	
	CNPJ:	21.691.178/0001-04	
	2º MEDIÇÃO	VALOR	R\$ 373.931,94
INICIO: 12/02/2026 FIM: 12/10/2027	DATA:	30 DE JUNHO DE 2026	

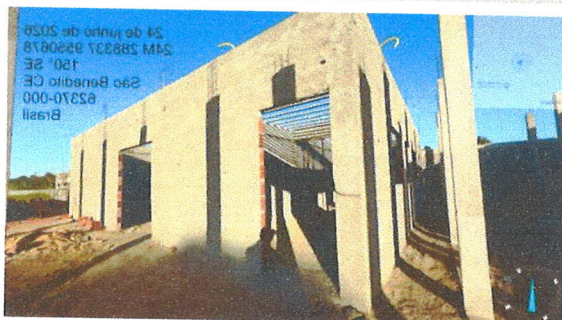


FUNDAÇÕES, ESTRUTURA E ALVENARIA BLOCO B



FUNDAÇÕES, ESTRUTURA E ALVENARIA BLOCO B

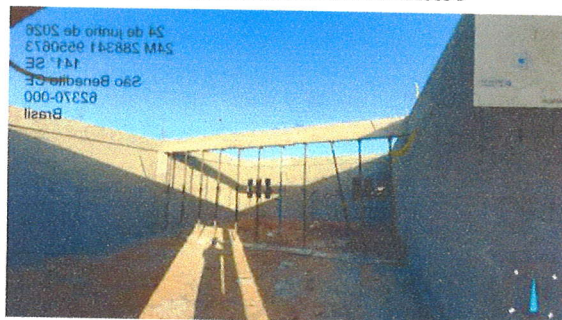


FUNDAÇÕES, ESTRUTURA E ALVENARIA BLOCO B

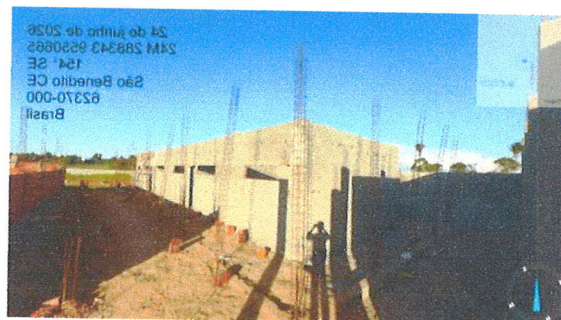

FUNDAÇÕES, ESTRUTURA E ALVENARIA BLOCO E



FUNDAÇÕES, ESTRUTURA E ALVENARIA BLOCO D

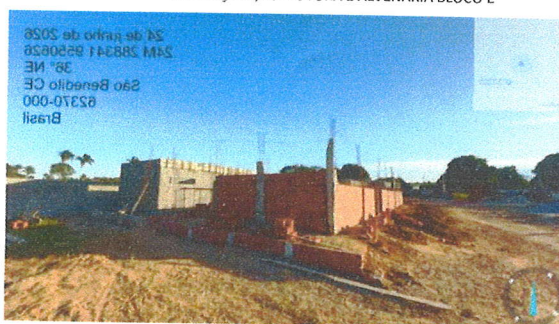

FUNDAÇÕES, ESTRUTURA E ALVENARIA BLOCO D, BLOCO E


ANTONIO ERISON
 MOREIRA DE
 MESQUITA:04259051
 369

Assinado de forma digital
 por ANTONIO ERISON
 MOREIRA DE
 MESQUITA:04259051369

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			
Contratação dos serviços técnicos especializados em engenharia civil para a Construção de uma Escola de Ensino Básico no Sítio Jacarandá, Município de São Benedito/CE	CONTRATADA:	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME	
	CNPJ:	21.691.178/0001-04	
	2º MEDIÇÃO	VALOR	R\$ 373.931,94
INICIO: 12/02/2026	FIM: 12/10/2027	DATA:	30 DE JUNHO DE 2026



FUNDAÇÕES BLOCO G

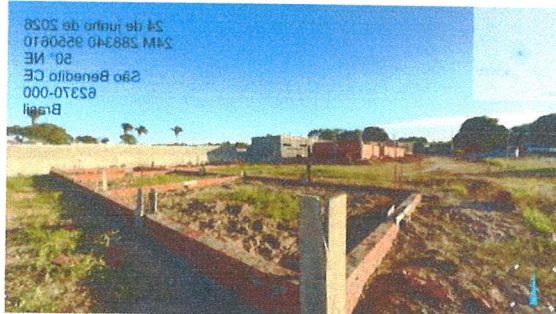

FUNDAÇÕES BLOCO G

ANTONIO ERISON
MOREIRA DE
MESQUITA:04259
051369

Assinado de forma
digital por ANTONIO
ERISON MOREIRA DE
MESQUITA:042590513
69

RECIBO Nº NF 3416

EMME ENGENHARIA – ME, inscrita no CNPJ sob nº 21.691.178/0001-04, por intermédio de seu representante legal, Sr. **ANTONIO ERISON MOREIRA DE MESQUITA**, portador da Carteira de Identidade nº 20070126245 SSP-CE e do C.P.F nº 042.590.513-69, **DECLARA**, que recebi nesta data a quantia de **R\$ 373.931,94 (TREZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)** da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE, valor que consta na nota fiscal nº 3416, referente à 2ª MEDIÇÃO dos serviços de **CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO BÁSICO NO SÍTIO JACARANDÁ**, sob o contrato nº **2026.01.14.01**.


DADOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 4484

C/C: 577856011-3

Santa Quitéria - CE, ____ de _____ de 202__.



A. Erison M. de Mesquita
Socio Proprietário
CPF 042.590.513-69

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 11

OBRA: Construção de uma Escola de Ensino Básico

CONTRATO: 2026.01.14.01

RESP. TÉCNICO: ERISON MESQUITA

ENDEREÇO: Sítio Jacarandá, São Benedito - CE>

Nº DA ART: CE20261801599

Nº CREA-CE: 50.350-D

DATA:
01/05/2026

MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	-	SERVENTE	4	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
MESTRE DE OBRAS	-	ARMADOR	1	RETRO ESCAVADEIRA	1
ENCARREGADO	-	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	-	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-

TAREFAS REALIZADAS

- 1) LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO
- 2) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO
- 3) FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X
- 4) CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa
- 5) ARMADURA DE AÇO CA 50/60
- 6) IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
- 7) ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
- 8) ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m

ANOTAÇÕES

- 1) PERÍODO: 25/04/2026 à 01/05/2026
- 2) BLOCO B
- 3)
- 4)

ASSINATURAS

ANTONIO ERISON
MOREIRA DE
MESQUITA:04259051
369Assinado de forma digital
por ANTONIO ERISON
MOREIRA DE
MESQUITA:04259051369DAVID DE SOUSA
FERNANDES:968
12052353Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA
FERNANDES:96812052353
ND C=BR, CN=CP, OU=AC Soluti Multipl vs. Out
30359590103, OU=Videconferencia, DN=Certificado
P=AT CHAVO DE SOUSA FERNANDES 96812052353
Localização
Data: 2026.07.28 16:47:42-0300
Fórm PDF Editor Versão: 2025.2.1

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

№ 12

OBRA: Construção de uma Escola de Ensino Básico

CONTRATO: 2026.01.14.01

RESP. TÉCNICO: ERISON MESQUITA

ENDEREÇO: Sítio Jacarandá, São Benedito - CE>

Nº DA ART: CE20261801599

Nº CREA-CE: 50.350-D

DATA:

08/05/2026



MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	-	SERVENTE	4	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
MESTRE DE OBRAS	-	ARMADOR	1	RETRO ESCAVADEIRA	1
ENCARREGADO	-	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	-	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-

TAREFAS REALIZADAS

- 1) LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO
- 2) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO
- 3) FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X
- 4) CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa
- 5) ARMADURA DE AÇO CA 50/60
- 6) IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
- 7) ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
- 8) ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m

ANOTAÇÕES

- 1) **PERÍODO: 04/05/2026 à 08/05/2026**
- 2) **BLOCO B**
- 3)
- 4)

ASSINATURAS

ANTONIO ERISON
MOREIRA DE
MESQUITA:042590
369

Assinado de forma digital
por ANTONIO ERISON
MOREIRA DE
MESQUITA:04259051369

DAVID DE SOUSA
FERNANDES:968
12052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA
 FERNANDES.96812052353
 ID: CN=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multigê v5, OU=35035006000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado
 PF AT, CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES.96812052353
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização
 Data: 2026.07.08 16:47:42-0300'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 13

OBRA: Construção de uma Escola de Ensino Básico

CONTRATO: 2026.01.14.01

RESP. TÉCNICO: ERISON MESQUITA

ENDEREÇO: Sítio Jacarandá, São Benedito - CE>

Nº DA ART: CE20261801599

Nº CREA-CE: 50.350-D

DATA:

15/05/2026



MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	-	SERVENTE	4	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
MESTRE DE OBRAS	-	ARMADOR	1	RETRO ESCAVADEIRA	1
ENCARREGADO	-	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	-	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-

TAREFAS REALIZADAS

- 1) LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO
- 2) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO
- 3) FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X
- 4) CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa
- 5) ARMADURA DE AÇO CA 50/60
- 6) IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
- 7) ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
- 8) ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m

ANOTAÇÕES

- 1) PERÍODO: 11/05/2026 à 15/05/2026
- 2) BLOCO D
- 3)
- 4)

ASSINATURAS

ANTONIO ERISON
MOREIRA DE
MESQUITA:04259051
369Assinado de forma digital
por ANTONIO ERISON
MOREIRA DE
MESQUITA:04259051369DAVID DE SOUSA
FERNANDES:968
12052353Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA
FERNANDES:96812052353
ND: CNBR, CNCP-Brasil, OU=AC SOLUTi Multis v5, OU=350359000120, OU=Empresaria, OU=Certificado
PP A1: CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353
Localização
Data: 2026.01.08 16:47:42.63007
Formato PDF Editor Versão: 2025.2.1

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 14

OBRA: Construção de uma Escola de Ensino Básico

CONTRATO: 2026.01.14.01

RESP. TÉCNICO: ERISON MESQUITA

ENDEREÇO: Sítio Jacarandá, São Benedito - CE>

Nº DA ART: CE20261801599

Nº CREA-CE: 50.350-D

DATA:

22/05/2026



MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	-	SERVENTE	4	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
MESTRE DE OBRAS	-	ARMADOR	1	RETRO ESCAVADEIRA	1
ENCARREGADO	-	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	-	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-

TAREFAS REALIZADAS

- 1) LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO
- 2) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO
- 3) FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X
- 4) CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa
- 5) ARMADURA DE AÇO CA 50/60
- 6) IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
- 7) ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
- 8) ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m

ANOTAÇÕES

- 1) PERÍODO: 18/05/2026 à 22/05/2026
- 2) BLOCO D
- 3)
- 4)

ASSINATURAS

ANTONIO ERISON
MOREIRA DE
MESQUITA:04259051
369Assinado de forma digital
por ANTONIO ERISON
MOREIRA DE
MESQUITA:04259051369DAVID DE SOUSA
FERNANDES:968
12052353Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA
FERNANDES:96812052353
TOD. CHSE, CNCP-SIG, OUVAC SOLUUI Multipl v5, OUV
3628090600120, OUV-Videoconferencia, OUV-Certificado
PP. AT. CH-DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizado:
Data: 2026.07.08 16:47:42-03:00
Formato: PDF Editor Versão: 2025.2.1

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

№ 15

OBRA: Construção de uma Escola de Ensino Básico

CONTRATO: 2026.01.14.01

RESP. TÉCNICO: ERISON MESQUITA

ENDEREÇO: Sítio Jacarandá, São Benedito - CE>

Nº DA ART: CE20261801599

Nº CREA-CE: 50.350-D

DATA:
29/05/2026



MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	-	SERVENTE	4	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
MESTRE DE OBRAS	-	ARMADOR	1	RETRO ESCAVADEIRA	1
ENCARREGADO	-	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	-	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-

TAREFAS REALIZADAS

- 1) LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO
- 2) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO
- 3) FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X
- 4) CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa
- 5) ARMADURA DE AÇO CA 50/60
- 6) IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
- 7) ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
- 8) ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m

ANOTAÇÕES

- 1) **PERÍODO: 25/05/2026 à 29/05/2026**
- 2) **BLOCO E**
- 3)
- 4)

ASSINATURAS

ANTONIO ERISON
MOREIRA DE
MESQUITA:04259051
369

Assinado de forma digital
por ANTONIO ERISON
MOREIRA DE
MESQUITA:04259051369

DAVID DE SOUSA
FERNANDES:968
12052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA
FERNANDES 96812052535
NID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=38030806000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado
PF AF, CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES 96812052535
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.08 18:47:42-0300
Fonte PDF: Evid. Verif. 2025.2.1

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

№ 16

OBRA: Construção de uma Escola de Ensino Básico

CONTRATO: 2026.01.14.01

RESP. TÉCNICO: ERISON MESQUITA

ENDEREÇO: Sítio Jacarandá, São Benedito - CE>

Nº DA ART: CE20261801599

Nº CREA-CE: 50.350-D

DATA:
05/06/2026



MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	-	SERVENTE	4	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
MESTRE DE OBRAS	-	ARMADOR	1	RETRO ESCAVADEIRA	1
ENCARREGADO	-	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	-	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-

TAREFAS REALIZADAS

- 1) LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO
- 2) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO
- 3) FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X
- 4) CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa
- 5) ARMADURA DE AÇO CA 50/60
- 6) IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
- 7) ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
- 8) ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3,00m

ANOTAÇÕES

- 1) **PERÍODO: 01/06/2026 à 05/06/2026**
- 2) **BLOCO E**
- 3)
- 4)

ASSINATURAS

ANTONIO ERISON
MOREIRA DE
MESQUITA:0425905
369

Assinado de forma digital
por ANTONIO ERISON
MOREIRA DE
MESQUITA:04259051369

DAVID DE SOUSA
Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA
FERNANDES:96812052353
NID: C=BR, O=CIC-Bras, OU=CAP SOLUTi Múltipla vs, CN=3030000000120, OU=Videoconferência, OU=Certificado
PE AC, CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353
FERNANDES:968
Razão: Eu sou o autor deste documento
12052353
Localização:
Data: 2026.07.08 18:47:42-0300

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 17

OBRA: Construção de uma Escola de Ensino Básico

CONTRATO: 2026.01.14.01

RESP. TÉCNICO: ERISON MESQUITA

ENDEREÇO: Sítio Jacarandá, São Benedito - CE>

Nº DA ART: CE20261801599

Nº CREA-CE: 50.350-D

DATA:

12/06/2026



MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	-	SERVENTE	4	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
MESTRE DE OBRAS	-	ARMADOR	1	RETRO ESCAVADEIRA	1
ENCARREGADO	-	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNC	-
COMPRADOR	-	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-

TAREFAS REALIZADAS

- 1) LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO
- 2) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO
- 3) FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X
- 4) CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa
- 5) ARMADURA DE AÇO CA 50/60
- 6) IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
- 7) ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
- 8) ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m

ANOTAÇÕES

- 1) PERÍODO: 08/06/2026 à 12/06/2026
- 2) BLOCO E
- 3)
- 4)

ASSINATURAS

ANTONIO ERISON
MOREIRA DE
MESQUITA:04259051
369Assinado de forma digital
por ANTONIO ERISON
MOREIRA DE
MESQUITA:04259051369DAVID DE SOUSA
FERNANDES:968
12052353Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA
FERNANDES:96812052353
DN: cn=DAVID DE SOUSA, o=EMME ENGENHARIA, ou=Certificado
PP A1, ou=DAVID DE SOUSA, email=DAVID@EMMEENGENHARIA.COM.BR, c=BR
Email: Eu sou o autor deste documento
Localizado:
Data: 2026.07.08 10:47:42-03:00
Firmado: 2026.07.08 10:47:42-03:00

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

№ 18

OBRA: Construção de uma Escola de Ensino Básico

CONTRATO: 2026.01.14.01

RESP. TÉCNICO: ERISON MESQUITA

ENDEREÇO: Sítio Jacarandá, São Benedito - CE>

Nº DA ART: CE20261801599

Nº CREA-CE: 50.350-D

DATA:

19/06/2026



MANHÃ

x

TARDE

X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	-	SERVENTE	4	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
MESTRE DE OBRAS	-	ARMADOR	1	RETRO ESCAVADEIRA	1
ENCARREGADO	-	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	-	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-

TAREFAS REALIZADAS

- 1) LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO
- 2) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO
- 3) FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X
- 4) CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa
- 5) ARMADURA DE AÇO CA 50/60
- 6) IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
- 7) ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
- 8) ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m

ANOTAÇÕES

- 1) **PERÍODO: 15/06/2026 à 19/06/2026**
- 2) **BLOCO F**
- 3)
- 4)

ASSINATURAS

ANTONIO ERISON
MOREIRA DE
MESQUITA:04259051
369

Assinado de forma digital
por ANTONIO ERISON
MOREIRA DE
MESQUITA:04259051369

DAVID DE SOUSA
FERNANDES:968
12052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA
FERNANDES 9681205235
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5, CN=383035060000120, OU=Videoconferência, OU=Certificado
PF A1, CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES 9681205235
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2026.07.08 16:47:42-03'00'
Email: RIDE@id.uff.br - 2004.2.2

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 19

OBRA: Construção de uma Escola de Ensino Básico

CONTRATO: 2026.01.14.01

RESP. TÉCNICO: ERISON MESQUITA

ENDEREÇO: Sítio Jacarandá, São Benedito - CE>

Nº DA ART: CE20261801599

Nº CREA-CE: 50.350-D

DATA:

30/06/2026



MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	-	SERVENTE	4	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	-
MESTRE DE OBRAS	-	ARMADOR	1	RETRO ESCAVADEIRA	1
ENCARREGADO	-	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	-
COMPRADOR	-	SOLDADOR	-	GUINDASTE	-

TAREFAS REALIZADAS

- 1) LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO
- 2) ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO
- 3) FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X
- 4) CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa
- 5) ARMADURA DE AÇO CA 50/60
- 6) IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
- 7) ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
- 8) ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m

ANOTAÇÕES

- 1) PERÍODO: 22/06/2026 à 30/06/2026
- 2) BLOCO F
- 3)
- 4)

ASSINATURAS

ANTONIO ERISON
MOREIRA DE
MESQUITA:04259
051369

Assinado de forma
digital por ANTONIO
ERISON MOREIRA DE
MESQUITA:042590513
69

DAVID DE SOUSA
FERNANDES:968
12052353

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA
FERNANDES:96812052353
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, CN=380806000120, OU=Videoconferencia, OU=Certificado
P.A.1, CN=DAVID DE SOUSA FERNANDES:96812052353
Email: E o autor deste documento
Emitido em 22/06/2026 16:47:42-0300
Data: 2026.07.06 16:47:42-0300
Formato: PDF Editor Versão: 2023.2.1

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE
